H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE ABASOLO, TAMAULIPAS

TAMAULIPAS

MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 16 DE JULIO DEL 2019
ASUNTO: ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
C. Lázaro Cárdenas Núm. 410 entre Flores Magón y Canales
Col. Doctores
C.P. 87024
VICTORIA TAM.

P R E S E N T E:

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMA A USTED QUE PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA AMPARADA BAJO EL CONTRATO GC-07-19 LA SUPERVISIÓN POR ESTE DEPARTAMENTO ESTARÁ A CARGO DEL ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA PARA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA.

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ABASOLO, TAM.

OBRAS PUBLICAS 2018-2021

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ

Calle LAZARO CARDENAS NUM. 410 ENTRE FLORES MAGON Y CANALES COL. DOCTORES
CP. 87024., en Ciudad Victoria, Tam.,

AVISO DE INICIO DE OBRA Y ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR

ABASOLO TAM. A 16 DE JULIO DEL 2019

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Por medio del presente le informo que con esta fecha se iniciaron los trabajos correspondientes a la:

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

Amparados con el contrato GC-07-19, y a lo cual su servidor Ing. Armando David Vanoye Sánchez supervisará los trabajos para atender cualquier observación o sugerencia de parte de la supervisión del municipio y así cumplir con los trabajos contratados en tiempo y forma.

Sin otro de momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
CONTRATISTA

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ

Calle LAZARO CARDENAS NUM. 410 ENTRE FLORES MAGON Y CANALES COL. DOCTORES
CP. 87024., en Ciudad Victoria, Tam.,

AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA

ABASOLO TAM. A 23 DE OCTUBRE DEL 2019

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO QUE CON ESTA FECHA TERMINARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. DEL CONTRATO GC-07-19. PARA CUALQUIER SUGERENCIA U OBSERVACIÓN Y PARA CUMPLIR CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TIEMPO Y FORMA.

SIN OTRO DE MOMENTO LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
CONTRATISTA

RFC emisor:	VIDA690102SU2	**Folio fiscal:**	AAA1E66A-6EFD-43B4-B0E7-8E0498F14945
Nombre emisor:	ALFREDO VIDALES ORTIZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000403258748
RFC receptor:	MAT780101AGA	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	87024 2019-07-17 12:33:10
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS		
Uso CFDI:	Construcciones	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
72152710		1	E48	SERVICIO	386415.23	386415.23			
Descripción	ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N° GC-07-19 RAMO: GASTO CORRIEN TE CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36m2 EN LA COL.MA NUEL CAVAZOS LERMA EN EL NCP NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	386415.23	Tasa	16.0000%	61826.44

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago:	Pago en una sola exhibición

Subtotal			$ 386,415.23
Impuestos Trasladados	IVA	16.0000%	$ 61,826.44
Total			**$ 448,241.67**

Sello digital del CFDI:

AHYJ39CbjCBgJbEsbJrJpmJpAlhmlkaCinKh+v1ZTuuS5zRd644mTtN5Gw95JfCVk6Mbi9oDkDEAF4k4CR26+V8axXcHB7ehM5XsyjRMJvindsgB/3FslRSaqd6/Zls2FfcWh94zHbRoRX4GY2
/BnrJC7cpWFyjlov/50ZjWaqXXDAzEUX0RxaNB5y3BZDiZp6thNJEbCwTIBU8Ws+vtZOMmd0jidFUKGQUK62LrDdzhZnqz07mOnyAJwqJDWEtf7WlJJpKV6Y/0oSSh8Tbxd22qjkWeJed7QP
HgbqPfwg3vl2x5XYRk7UE79gGjwQz5Km7MCUv018SLs0sqoTzh4w==

Sello digital del SAT:

YFDkhW0SxwSolveAb/cCC7MbWyq23b2Ykch31fkb6S6ce8aynE2OVEvAd6rrsmgTGwcmCJbn3wNKTurFNtTT9uDhrktu6cRc8gGCcyaTcxfGMwYa9cWx+HPcnXOvO7qbjhHhfzFl+YvGjuD
BUnSCfq2m2Hic2uC5FI6MEM8DJc5NBj1oWfECI8d2G8s5RUiRdx6nDVLZHkAVGlb7CtlGfazTsnZJVkZ3kuyEpxdseuhaLUGaFYkAwdwDhspiEzJ5ipCiyaLyx+d58s0rwg7HSx9d2Esg29klzE
MTcjd/Z/zrkvkwvwi1y78GG54WOOpF9Y8w8kw+l2UAkwkgdUg6rA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E66A-6EFD-43B4-B0E7-8E0498F14945|2019-07-17T12:48:54|SAT970701NN3|AHYJ39CbjCBgJbEsbJrJpmJpAlhmlkaCinKh+v1ZTuuS5zRd6
44mTtN5Gw95JfCVk6Mbi9oDkDEAF4k4CR26+V8axXcHB7ehM5XsyjRMJvindsgB/3FslRSaqd6/Zls2FfcWh94zHbRoRX4GY2/BnrJC7cpWFyjlov/50ZjWaq
XXDAzEUX0RxaNB5y3BZDiZp6thNJEbCwTIBU8Ws+vtZOMmd0jidFUKGQUK62LrDdzhZnqz07mOnyAJwqJDWEtf7WlJJpKV6Y/0oSSh8Tbxd22qjkWeJe
d7QPHgbqPfwg3vl2x5XYRk7UE79gGjwQz5Km7MCUv018SLs0sqoTzh4w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2019-07-17 12:48:54
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DORAMA

FOLIO 1136872

Datos de la Fianza

Movimiento : POLIZA
Fianza : 19A27855
Ramo : ADMINISTRATIVO
Subramo : OBRA
Obligación : ANTICIPO
Moneda : PESOS
Agente : 855155
Nombre : FIDEL BALDERAS RODRIGUEZ
División : FORANEA
Monto Total de la Fianza: **$448,241.67**

R.F.C. Fiado : VIOA690102SU2
Endoso : 19A27855

Monto Afianzado del Movimiento **$448,241.67**

Código Seguridad: 8sKmleN6
C.C. : 3003010

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

PARA GARANTIZAR POR: ALFREDO VIDALES ORTIZ, CON R.F.C. VIOA690102SU2, LA CORRECTA INVERSIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA RECIBE DEL BENEFICIARIO A CUENTA DE LOS TRABAJOS DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA: GC-07-19, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES, DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2019, CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM", EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE FIANZAS DORAMA, S.A., PODRÁ EXCEDER LA CANTIDAD DE $448,241.67 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.) POR LA QUE SE EXPIDE ESTA FIANZA.

FIANZAS DORAMA, S.A. SE SOMETE EXPRESAMENTE A: A).- QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIERE CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO. B).- QUE LA FIANZA ASEGURA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO. C).- QUE FIANZAS DORAMA, S.A. ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. D).- QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA LA CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR EL AYUNTAMIENTO QUE ASI LO INDIQUE.*** FIN DE TEXTO ***

Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de:
*$448,241.67 (***CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 67/100 M.N.***)*

MIGUEL ÁNGEL ROBLES SAN MARTIN
JEFE DE OFICINA

TAMPICO, TAMAULIPAS, A 15 DE JULIO DE 2019

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx
Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:
a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Del. Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx
LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 019A 2785 5113 6872

asLp6g0Z6smNy8yXjiKoDQlVLfGCfvIrwK+/eZbq9ON/IXNkdhDk8TqOjav6ONVAi79BbAIa1RxKq12DwMxjrQe7ea+Ss1vhb9KUoR3Z5nBMaN9AV81oHFr6profjoBVB51gmdhi3HCvenAzzSQr62KUi9gV2SAaJgK0j8ZD=

FZD-001

DORAMA

Datos de la Fianza

FOLIO 1136882

Movimiento :	POLIZA	**R.F.C. Fiado :**	VIOA690102SU2	**Monto Afianzado del Movimiento**	**$149,413.89**
Fianza :	19A27858	**Endoso :**	19A27858		
Ramo :	ADMINISTRATIVO				
Subramo :	OBRA				
Obligación :	CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD				
Moneda :	PESOS	**Código Seguridad:**	FdvnnTkw		
Agente :	855155	**C.C. :**	3003010		
Nombre :	FIDEL BALDERAS RODRIGUEZ				
División :	FORANEA				
Monto Total de la Fianza:	**$149,413.89**				

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

PARA GARANTIZAR POR ALFREDO VIDALES ORTIZ, CON DOMICILIO EN: CALLE LAZARO CARDENAS 410, ENTRE FLORES MAGON Y CANALES, COL. DOCTORES, C.P.87024, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, CON R.F.C. VIOA690102SU2, EL CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA: GC-07-19 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2019, QUE CELEBRA POR UNA PARTE MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS Y POR LA OTRA PARTE ALFREDO VIDALES ORTIZ, RELATIVO A: "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM", CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $1,494,138.92 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO.

ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA, DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO RESPECTIVO, Y SOLO SE CANCELARÁ CUANDO ASÍ LO AUTORICE POR ESCRITO EL BENEFICIARIO. EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178, 282 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHOS PROCEDIMIENTOS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE ÉSTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN Y AL EFECTO LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, SE CONSTITUYE FIADORA DE ALFREDO VIDALES ORTIZ, Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD DEL IMPORTE DE ESTA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADOR NO CUMPLA CON EL CONTRATO DE REFERENCIA.*** FIN DE TEXTO ***

Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de:
*$149,413.89 (***CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 89/100 M.N.***)*

2w1M6UpbEs30lti+Qc4p8COfsW8UHTUm7R//zMlyuWfqp1hEgcrH15fhvp2xnUVu2x152q6WAMG7YcY6vIlIbbsfu2hEfq
YUMP7zMJir+Xu/yTLv+ZM1wkoQ0Bz5ew95OARdCX/WTWdNmzCeCjDuJHlogfIOolzKhC4MJR7FRY=

MIGUEL ANGEL ROBLES SAN MARTIN
JEFE DE OFICINA

TAMPICO, TAMAULIPAS, A 15 DE JULIO DE 2019

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx
Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:
a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Del. Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
R.F.C. FDO9411098R8

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx
LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 019A 2785 8113 6882

FZD-001

RFC emisor:	VIOA690102SU2	**Folio fiscal:**	BACE0415-BB18-4C06-AD2B-DEDCCA88DB0E
Nombre emisor:	ALFREDO VIDALES ORTIZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000500727605
RFC receptor:	MAT780101AGA	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	87024 2019-08-01 13:03:26
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Construcciones	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
72152710		1	E48	SERVICIO	665138.82	665138.82	4763.66		

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No.1(UNICA) TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36m2 EN LA COL.MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL NCP NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. IMPORTE DE LA ESTIMACION $ 793,943.89 AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 128,805.07 SUBTOTAL $ 665,138.82 MAS IVA $ 106,422 .21 TOTAL $ 771,561.04 MENOS DEDUCCIONES 0.10% RETENCION $ 793.94 0.50% SECODAM $ 3,969.72	IVA	Traslado	665138.82	Tasa	16.0000%	106422.21

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago:	Pago en una sola exhibición

Subtotal			$ 665,138.82
Descuento			$ 4,763.66
Impuestos Trasladados	IVA	16.0000%	$ 106,422.21
Total			**$ 766,797.37**

Sello digital del CFDI:

TK1Tqspu2xRp8dylbQsDtT3DJMxFBCkkQ3BPokYCBNUDo/Sc4aZav9UXKm8fApUIVfvGMOkbi5FgZ1EYW8akqcYx3WQmlm085DMxy4HktLDfJuFyAkd+wyPKn1bkHEPcVtsEoe7EVhsyzUMuF3McMTP3t2zJzuWO2j2pv0Z93+4PTzU9FU9PLIBa5ZHg3kmy/LRHIMIdrYSI79w8xTB7C1z2ZRTI3YNWP49QaCCh5Wv4oiInZKTSDICgozUT7Ru/dSgqYwih9RUp/xKyLtO+5xcxM/fKZaH6eY8wi00jhggnWnolftHNhvDAtEE0HquTuEA1sjVKR+aUO/BAv1AAcw==

Sello digital del SAT:

S1ZhAD8XYweo+J8+VcPTOY7/iY1CXBYVtNuxRpBbwuP7RU5kPCm7IfdofREpvjPHA53VVQ6LEZFg5EQ0Ss8kn+EtoMWu7RAmO0np55p89Khv5vaqcqNN7OHzqgW69BYTo50YcO8Dbjxw6pk6gjqRykdTn6BOQbAMvi0/+pkL2Txxjs5/GHP2K62uwHzx/gzMYoXZUD1pp6yMJW+KKvV4DsRNOHCNoWKi4WEI6G2KSUqyPUxdwbQkKP7Ky8UVy6D5pSZmRI78UX0pR3IWhjZFkzOm1P/K/hI3TDoDuRU+xsKvSt2KP/JzLcx9Zikk0ZkIw7w7kW9vz7WHS2bQ+34row==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BACE0415-BB18-4C06-AD2B-DEDCCA88DB0E|2019-08-01T13:13:34|SAT970701NN3|TK1Tqspu2xRp8dylbQsDtT3DJMxFBCkkQ3BPokYCBNUDo/Sc4aZav9UXKm8fApUIVfvGMOkbi5FgZ1EYW8akqcYx3WQmlm085DMxy4HktLDfJuFyAkd+wyPKn1bkHEPcVtsEoe7EVhsyzUMuF3McMTP3t2zJzuWO2j2pv0Z93+4PTzU9FU9PLIBa5ZHg3kmy/LRHIMIdrYSI79w8xTB7C1z2ZRTI3YNWP49QaCCh5Wv4oiInZKTSDICgozUT7Ru/dSgqYwih9RUp/xKyLtO+5xcxM/fKZaH6eY8wi00jhggnWnolftHNhvDAtEE0HquTuEA1sjVKR+aUO/BAv1AAcw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-08-01 13:13:34

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

HSBC | Pago Prioritario

Usted ha autorizado este pago

El estatus de este pago 02395J801RMX es: Recibido por el banco

Resumen de Pago - Transferencia HSBC y a Otros Bancos

Referencia numérica	02395J801RMX
Tipo de Transacción	Pago Prioritario
Imprimir comprobante	08 Agosto 2019 11:03

Pagar desde

MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
MX MXHBMICA4062214382 MXN

Pagar a

ALFREDO VIDALES ORTIZ
MX 6351402071

Monto **MXN 766,797.37**

Fecha valor (dd/mm/aaaa)	08 Agosto 2019
Su Referencia	GC0719
Ubicación del Banco Beneficiario	México
Identificador del Banco Beneficiario	Código del Banco 021
Banco Beneficiario	HSBC

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
Póliza: C00484 Del 08/08/2019

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2019 12:17 p. m.
Página: 1

Concepto: 6109 GC ESTIMACIÒN CONSTRUCCIÒN DE PLAZA COL. MANUEL CAVAZOS, N BRAVO

Beneficiario: **ALFREDO VIDALES ORTÌZ**

Folio / Cheque : T605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS	$771,561.03		6109 PLAZA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA N.BRAVO
0002	2117-20-05	.005 RETENCIONES GASTO		$3,969.72	6109 PLAZA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA, N.BRAVO
0003	2117-21-05	.001 RETENCIONES ASE GASTO		$793.94	6109 PLAZA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA, N.BRAVO
0004	1112-01-4382	GASTO CORRIENTE 2019		$766,797.37	6109 PLAZA COL.MANUEL CAVAZOS LERMA, EJ N.BRAVO
0005	8240-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS	$771,561.03		Movimiento Directo Automático
0006	8220-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS		$771,561.03	Movimiento Directo Automático
0007	8250-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS	$771,561.03		Movimiento Directo Automático
0008	8240-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS		$771,561.03	Movimiento Directo Automático
0009	1235-6-6162	GASTO CTE. OTRAS	$771,561.03		Movimiento Directo Automático
0010	2113-6162	GASTO CTE. OTRAS		$771,561.03	Movimiento Directo Automático
0011	8260-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS	$771,561.03		Movimiento Directo Automático
0012	8250-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS		$771,561.03	Movimiento Directo Automático
0013	8260-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS		$771,561.03	Movimiento Directo Automático
0014	2113-6162	GASTO CTE. OTRAS	$771,561.03		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,629,366.18	4,629,366.18	

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021

C. ILIANA ARACELY MARES ARGUELLES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2021

C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL 2018 - 2021

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

HSBC

Transferencias a terceros

Fecha: 08/08/2019
Hora: 04:03:34
Página: 1

Fecha valor	08/08/2019	Número de referencia de la instrucción:	02395J801RMX
Fecha de liquidación:	08/08/2019	Hora de liquidación:	11:03:18 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4062214382
Nombre del Ordenante:	MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
Referencia del ordenante:	GC0719
Comisión cobrada:	0.00
Moneda:	MXN
Monto:	766,797.37

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	6351402071	Tipo de Transacción:	Terceros
Nombre del Beneficiario:	ALFREDO VIDALES ORTIZ	Tipo de Cambio:	
Banco Receptor:	HSBC		
Referencia del Beneficiario:			

15 6109-

*****Emitido por: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC*****

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
Póliza: C00669 Del 02/10/2019

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2019 11:00 a. m.
Página: 1

Concepto: 6109 GC ESTIMACIÒN CONSTRUCCIÒN DE PLAZA COL. MANUEL CAVAZOS, N BRAVO

Beneficiario: **ALFREDO VIDALES ORTIZ** **Folio / Cheque : 605**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS	$274,336.22		6109 PLAZA COL. MANUEL CAVAZOS, N.BRAVO
0002	2117-20-05	.005 RETENCIONES GASTO		$2,470.53	6109 PLAZA COL. MANUEL CAVAZOS N BRAVO
0003	2117-21-05	.001 RETENCIONES ASE GASTO		$494.11	6109 PLAZA COL. MANUEL CAVAZOS, N BRAVO
0004	1112-01-4382	GASTO CORRIENTE 2019		$271,371.58	6109 PLAZA COL.MANUEL CAVAZOS N BRAVO.
0005	8240-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS	$274,336.22		Movimiento Directo Automático
0006	8220-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS		$274,336.22	Movimiento Directo Automático
0007	8250-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS	$274,336.22		Movimiento Directo Automático
0008	8240-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS		$274,336.22	Movimiento Directo Automático
0009	1235-6-6162	GASTO CTE. OTRAS	$274,336.22		Movimiento Directo Automático
0010	2113-6162	GASTO CTE. OTRAS		$274,336.22	Movimiento Directo Automático
0011	8260-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS	$274,336.22		Movimiento Directo Automático
0012	8250-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS		$274,336.22	Movimiento Directo Automático
0013	8260-15-1000-6109-6162-2	GASTO CTE. OTRAS		$274,336.22	Movimiento Directo Automático
0014	2113-6162	GASTO CTE. OTRAS	$274,336.22		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	1,646,017.32	1,646,017.32	

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021

C. ILIANA ARACELY MARES ARGUELLES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2021

C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL 2018 - 2021

Elaboró: supervisor

HSBC

Transferencias a terceros

Fecha: 02/10/2019
Hora: 07:14:58
Página: 1

Fecha valor	02/10/2019	Número de referencia de la instrucción:	59185KT00H2V
Fecha de liquidación:	02/10/2019	Hora de liquidación:	14:14:49 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4062214382
Nombre del Ordenante:	MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
Referencia del ordenante:	GC0719
Comisión cobrada:	0.00
Moneda:	MXN
Monto:	271,371.58

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	6351402071	Tipo de Transacción:	Terceros
Nombre del Beneficiario:	ALFREDO VIDALES ORTIZ	Tipo de Cambio:	
Banco Receptor:	HSBC		
Referencia del Beneficiario:			



*****Emitido por: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC*****

HSBC | Pago Prioritario

Usted ha autorizado este pago

El estatus de este pago 59185KT00H2V es: Recibido por el banco

Resumen de Pago - Transferencia HSBC y a Otros Bancos

Referencia numérica	59185KT00H2V
Tipo de Transacción	Pago Prioritario
Imprimir comprobante	02 Octubre 2019 14:14

Pagar desde

MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
MX MXHBMICA4062214382 MXN

Pagar a

ALFREDO VIDALES ORTIZ
MX 6351402071

Monto **MXN 271,371.58**

Fecha valor (dd/mm/aaaa)	02 Octubre 2019
Su Referencia	GC0719
Ubicación del Banco Beneficiario	México
Identificador del Banco Beneficiario	Código del Banco 021
Banco Beneficiario	HSBC

RFC emisor:	VIOA690102SU2	**Folio fiscal:**	3C0185E9-2444-48A2-981C-26F4CEC15EBE
Nombre emisor:	ALFREDO VIDALES ORTIZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000500727605
RFC receptor:	MAT780101AGA	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	87024 2019-10-02 12:21:04
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Construcciones	**Régimen fiscal:**	Personas Fisicas con Actividades Empresaria es y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
72152710		1	E48	SERVICIO	236496.74	236496.74	2964.64		

Descripción: TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL.MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. No.DE CONTRATO: GC-07- 19 RAMO: GASTO CORRIENTE ESTMACION:No.2 FINIQUITO CONTRAT ISTA ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ; IMP. DEL CONTRATO $ 1'494,13 8.92 IMPORTE DE LA ESTIMACION $ 494,106.90 MENOS AMORTIZACIO N DE ANTICIPO $ 257,610.16 MAS IVA $ 37,839.48 MENOS 0.10% RETENC ION $ 494.11 Y 0.50% SECODAM $2,470.53

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	236496.74	Tasa	16.0000%	37839.48

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago:	Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:	CONTADO

Subtotal			$ 236,496.74
Descuento			$ 2,964.64
Impuestos Trasladados	IVA	16.0000%	$ 37,839.48
Total			**$ 271,371.58**

Sello digital del CFDI:

hkgNvKMSI5btCIKV9w0zDvXsv415e33xPiUYxghjA2uoVwDyP02m+tgC/wSOyMWJXX1PrC5SXd3DvWvBrYrMcEOZnIwpxFsQ+dw7PN4qUuHe5ZsSZdy9QbIIHbsmrZlsBZvvvIIW/I0MqXDB
plWuAW29GXpRBaHcYhstLLdl9l3/Z/w4eZEh5iNEAQOgfi7Ti7v/ZckPhpMLITusA3IQa3inXVAf+Kae1qIRGooEzWkowvzwOxXqlC2wHCMhCbgdT1k6YABdnUwIfaVMiH5OQQMCaDg2srhvx
m3DUgpTlyd8zL6SwlACMfLNn5CWPw/aY1LM9M4o6Kajj/37p2u0dw==

Sello digital del SAT:

NFizOCLz9PlWVTjC8umHWSEtD2rhEoNxBjP6dOk5oyBJesgMuoM8S2XaJd++PnDw3DuQdD8fECxK22llZ807fAfbJfUk79903cG9MB4zlkqsw8rochZWehjtYrxxGEdh9M5OoTxMI6gCb6SLw
BcdFR4lpVS/LpbaOLcOqKyuo4ab2DTisnsnzhWT0bZixARPbWl0l7qq58Nd3Rgi2C8ooz4k9JjbHT6Ued0iUegN/OcD83DgvgBp6nBV3k+kNWDAWiHeFU39IknbiyFYjYiA0o1332owZmC2RD4
0ZdGttzJrSkfoTQJC2eM0MC6KyOAqTCuKbTQ1+UUsnNlWLFKIDw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3C0185E9-2444-48A2-981C-26F4CEC15EBE|2019-10-02T12:25:48|SAT970701NN3|hkgNvKMSI5btCIKV9w0zDvXsv415e33xPiUYxghjA2uoVwDyP
02m+tgC/wSOyMWJXX1PrC5SXd3DvWvBrYrMcEOZnIwpxFsQ+dw7PN4qUuHe5ZsSZdy9QbIIHbsmrZlsBZvvvIIW/I0MqXDBplWuAW29GXpRBaHcYhst
LLdl9l3/Z/w4eZEh5iNEAQOgfi7Ti7v/ZckPhpMLITusA3IQa3inXVAf+Kae1qIRGooEzWkowvzwOxXqlC2wHCMhCbgdT1k6YABdnUwIfaVMiH5OQQMCaDg
2srhvxm3DUgpTlyd8zL6SwlACMfLNn5CWPw/aY1LM9M4o6Kajj/37p2u0dw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-02 12:25:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Tam TAMAULIPAS

R E C I B O

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			Nº DE CONTRATO: GC-07-19
N.C.P. NICOLAS BRAVO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM.	RAMO: GASTO CORRIENTE	ESTIMACION: No. 1
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ			
DOMICILIO:Calle LAZARO CARDENAS NUM. 410 ENTRE FLORES MAGON Y CANALES COL. DOCTORES CP. 87024., en Ciudad Victoria, Tam.,			31 DE JULIO DEL 2019
R.F.C.	PADRON DE CONTR	IMP. DEL CONTRATO	BUENO POR:
VIOA 690102SU2		$ 1.494.138,92	$ 1.494.138,92
RECIBÍ DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO:		$ 766.797,36	FECHAS DE EJECUCION
(SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)			DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.: 1 (UNICA)	TRABAJOS DE:	CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.
	EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:	

ANTICIPOS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE	$386.415,23	$61.826,44	$448.241,67
AMORTIZACION ANTERI	$0,00	$0,00	$0,00
SUBTOTAL	$0,00	$0,00	$0,00
ESTA ESTIMACION	$128.805,07	$20.608,81	$149.413,88
SALDO POR AMORTIZAI	$257.610,16	$41.217,63	$298.827,79

D E D U C C I O N E S		
0.10% RETENCION	$	793,94
0,50% SECODAM:	$	3.969,72
TOTAL DE DEDUCCIONES	$	4.763,66

MONTO ASIGNADO	$		1.494.138,92
PAGOS ANTERIORES	$		448.241,67
SUB-TOTAL	$		1.045.897,25
IMPORTE DE LA ESTIMACION	$	793.943,89	
AMORTIZACION DE ANTICIPO	$	128.805,07	
SUB-TOTAL	$	665.138,82	
I.V.A.	$	106.422,21	
TOTAL	$	771.561,04	$ 771.561,04

AVANCES			PENA CONVENCIONAL
	FISICO	FINANCIERO	ACUM. ANTERIOR
PROGRAMADO %	100%	100%	ACTUAL
ESTIMADO %	100%	100%	DEVOLUCION $
			POR APLICAR $

DEDUCCIONES		
TOTAL DEDUCCIONES	$	4.763,66
NETO A PAGAR	$	766.797,36
SALDO DE ASIGNACION		$274.336,21

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ	C. MARTIN CASTILLO TORRES	LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA
CONTRATISTA	DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANPO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIO	CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ABASOLO, TAM. — OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ABASOLO, TAM. — SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ABASOLO, TAM. — CONTRALOR 2018 - 2021

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

ESTIMACION

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: GASTO CORRIENTE	Nº DE CONTRATO: GC-07-19
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019	
META 5631.36 M2		FECHA: 31 DE JULIO DEL 2019	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. ($)	VOLUMEN					IMPORTE ($)
				PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
2	TRAZO Y NIVELACION DE AREA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 73.80 X70.90 QUE COMPRENDE: LOCALIZACION GENERAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ASI COM EXPLANADA , TRAZO, ALINEAMIENTO, BANCOS DE REFERENCIA Y NIVELES PARA EL DESPLANTE DE LA OBRA, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	$ 6.50	5232.42	0.00	5232.42	5232.42	0.00	$ 34,010.73
3	EXCAVACION CON MOTOCONFORMADORA DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO Y MALEZA	M2	$ 3.60	5232.42	0.00	5232.42	5232.42	0.00	$ 18,836.71
4	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	$ 106.20	166.405	0.00	166.41	166.41	0.00	$ 17,672.21
5	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 DE 15X20X40 INCLUYE MANO DE OBRA,FORMAS,MANIOBRA DE TRANSPORTE Y CAMBIO DE FORMAS, EXCAVACION,MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	$ 396.50	289.4	0.00	289.40	289.40	0.00	$ 114,747.10
6	PLANTILLA DE DESPLANTE PARA CONSTRUCCION DE RODAPIE DE BLOCK EN ANDADORES DE 6 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 100KGS/CM2 INCLUYE EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	$ 185.20	319.76	0.00	319.76	319.76	0.00	$ 59,219.55
7	RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO FC 100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1 4 ,INCLUYE MATERIALLES HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	$ 82.50	99.86	0.00	99.86	99.86	0.00	$ 8,238.45
8	BANQUETA DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 EN ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE RELLENO ,EXCAVACION Y NIVELACION ,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	$ 368.50	1602.5	0.00	1468.70865671	1468.71	0.00	$ 541,219.14
								SUBTOTAL	$ 793,943.89

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
CONTRATISTA	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

GENERADORES

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.												ESTIMACION: No. 1 HOJA: 1 DE 2	
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO			MUNICIPIO: ABASOLO, TAM			RAMO: GASTO CORRIENTE			Nº DE CONTRATO: GC-07-19				
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ						PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019							
META 5631.36 M2						FECHA: 31 DE JULIO DEL 2019							
2	TRAZO Y NIVELACION DE AREA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 73.80 X70.90 QUE COMPRENDE: LOCALIZACION GENERAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ASI COM EXPLANADA , TRAZO, ALINEAMIENTO, BANCOS DE REFERENCIA Y NIVELES PARA EL DESPLANTE DE LA OBRA, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	A	1	5								
		M2	1	A	E		70.9	73.8		5232.42		5232.4	
3	EXCAVACION CON MOTOCONFORMADORA DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO Y MALEZA	M2					70.9	73.8		5232.42	1	5232.4	
4	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	E	1	5		1.15	70.9	81.535				
			5	A	E		1.15	73.8	84.87				
									166.405	166.405		166.41	
5	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 DE 15X20X40 INCLUYE MANO DE OBRA,FORMAS,MANIOBRA DE TRANSPORTE Y CAMBIO DE FORMAS, EXCAVACION,MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	A	1	5			73.8					
			E	1	5			73.8					
			1	A	E			70.9					
			5	A	E			70.9					
								289.4		289.4		289.4	
6	PLANTILLA DE DESPLANTE PARA CONSTRUCCION DE RODAPIE DE BLOCK EN ANDADORES DE 6 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 100KGS/CM2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	1 Y 5	A	E	4	0.4	31.2	49.92				
			3	A	E	4	0.4	22.95	36.72				
			A Y E	1	2	4	0.4	36.2	57.92				
			A Y E	4	5	4	0.4	36.2	57.92				
			A Y E	1	5	4	0.4	32.65	52.24				
			C	1	5	4	0.4	24.2	38.72				
			CENTRO	14XR-8X2.5		1	0.4	11.41	4.564				
						25		194.81	298.004			298	

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

Lorenzo A. Alvarez Z.

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

GENERADORES

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.								ESTIMACION: No. 1 HOJA: 2 DE 2	
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO			MUNICIPIO: ABASOLO, TAM			RAMO: GASTO CORRIENTE		Nº DE CONTRATO: GC-07-19	
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ						PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019			
META 5631.36 M2						FECHA: 31 DE JULIO DEL 2019			
7	RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40 2 HILADAS RELLENO CON CONCRETO FC 100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1 4 ,INCLUYE MATERIALLES HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2				1	0.4	249.65	99.86
8	BANQUETA DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 EN ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE RELLENO ,EXCAVACION Y NIVELACION ,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. A= PERIMETRO-APOTEMA/2	M2	A	1	5	1	2.5	73.8	184.5
			A	1	2	1	2.5	36.2	90.5
			A	4	5	1	2.5	36.2	90.5
			C	1-2,4-5		2	2.5	24.2	121
			E	1-2,4-5		2	2.5	36.2	181
			E	1	5	1	2.5	73.8	184.5
			1	A	E	1	2.5	17.38	43.45
			3	A-B,D-E		2	2.5	22.8	114
			5	A	E	1	2.5	70.9	177.25
		CENTRO EXPLANADA		A1-A2		332	50	282	282
								673.48	1468.7

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR


MUNICIPIO DE ABASOLO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 1 HOJA: 1 DE 1
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: GASTO CORRIENTE	Nº DE CONTRATO: GC-07-19
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019	
META 5631.36 M2		FECHA: 2 DE AGOSTO DEL 2019	

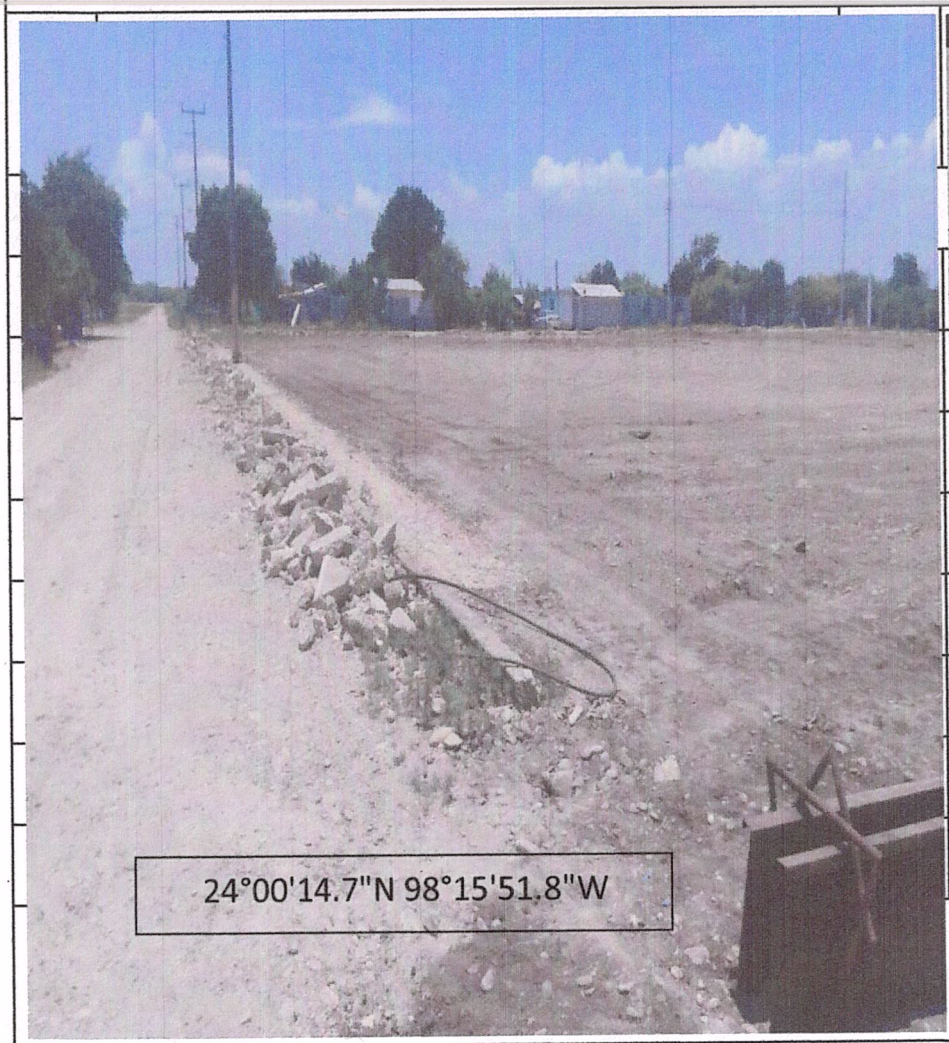

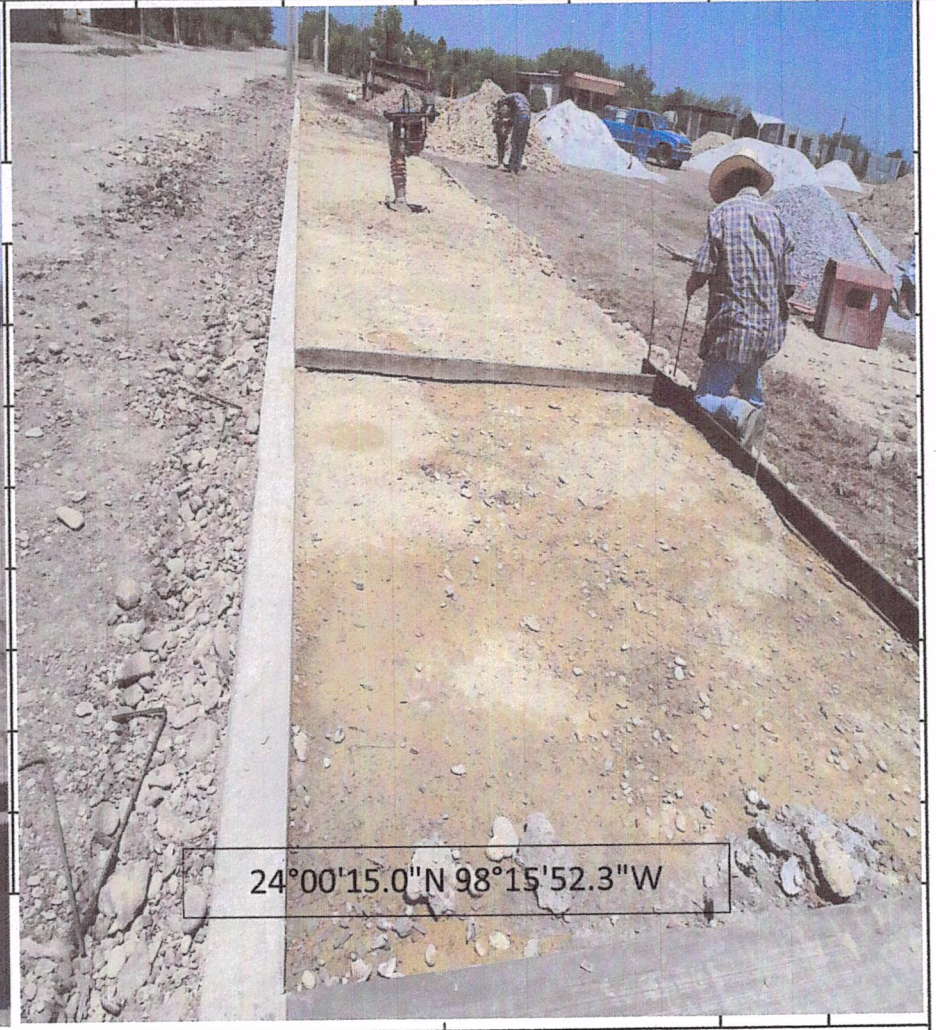

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
CONTRATISTA	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 1 HOJA: 1 DE 1
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: GASTO CORRIENTE	Nº DE CONTRATO: GC-07-19
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019	
META 5631.36 M2		FECHA: 2 DE AGOSTO DEL 2019	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
CONTRATISTA	SUPERVISOR


MUNICIPIO DE ABASOLO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 1 HOJA: 1 DE 1
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: GASTO CORRIENTE	Nº DE CONTRATO: GC-07-19
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019	
META 5631.36 M2		FECHA: 2 DE AGOSTO DEL 2019	

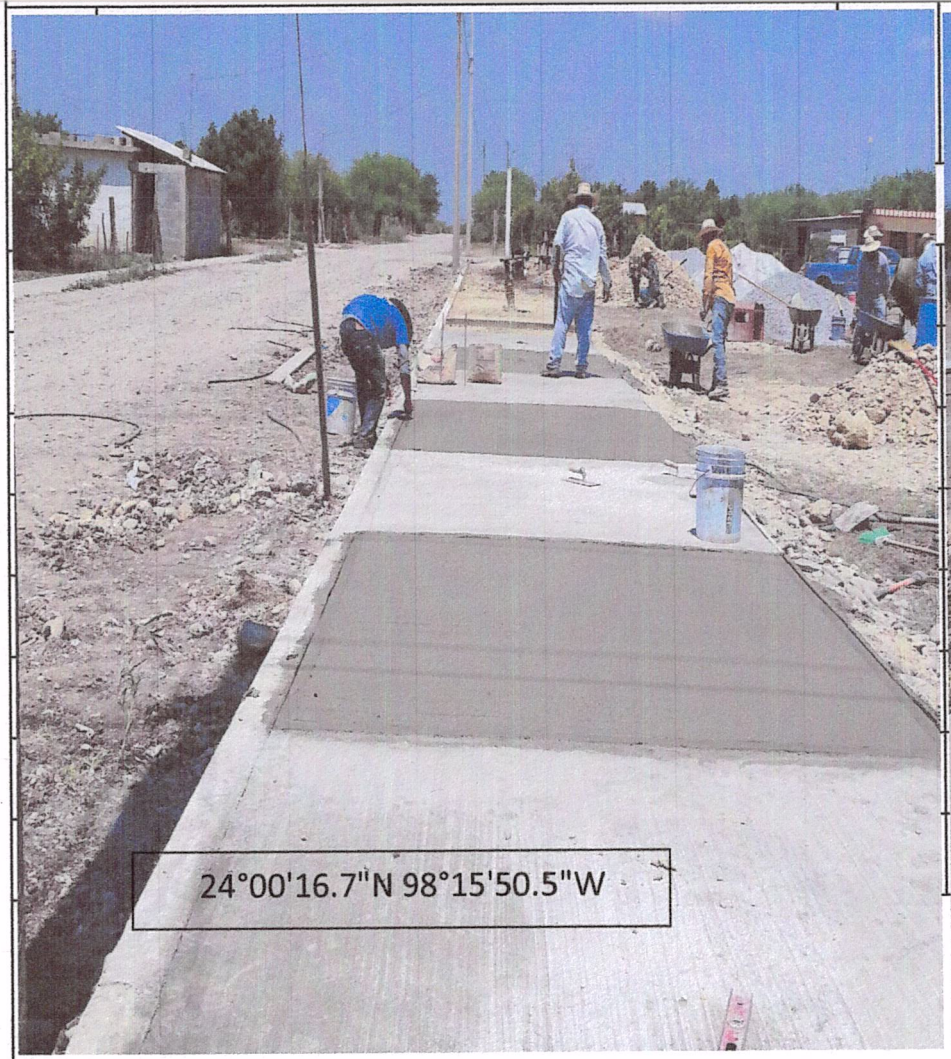

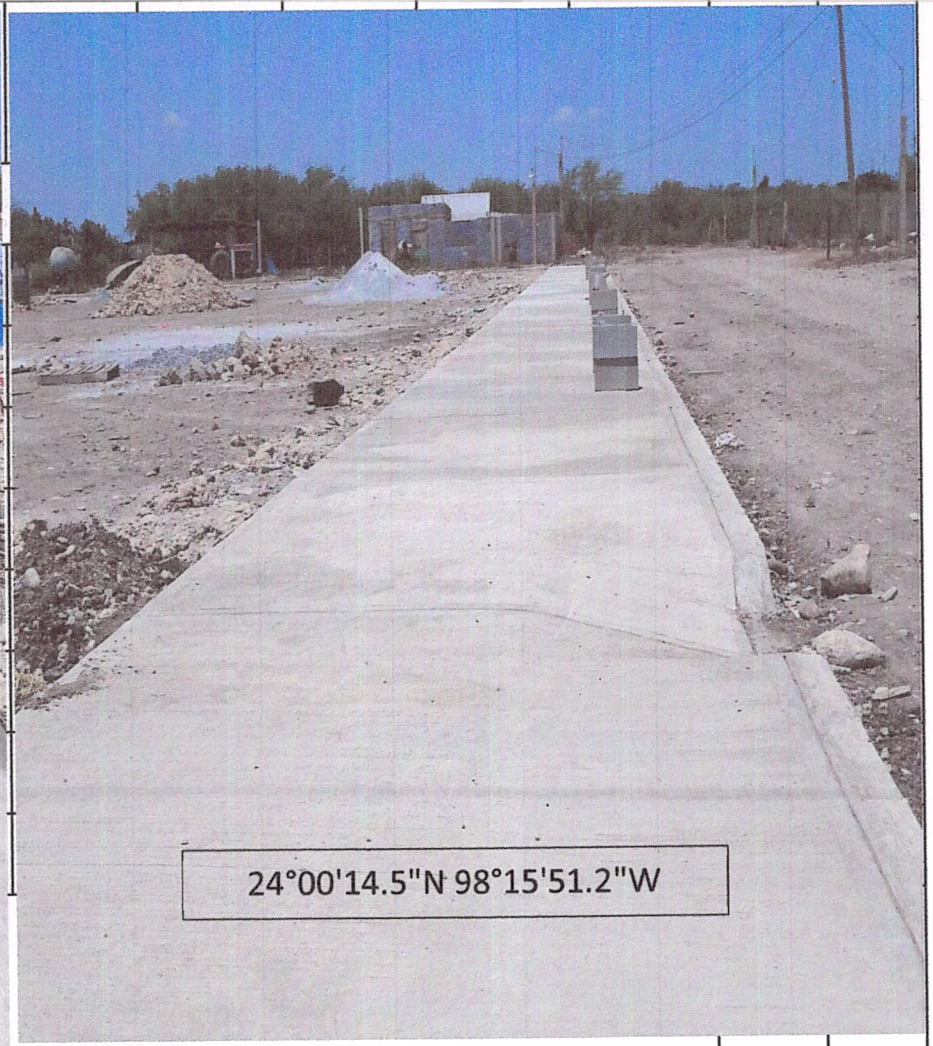

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
CONTRATISTA	Lorenzo Antonio Alvarez Z. SUPERVISOR


MUNICIPIO DE ABASOLO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 1 HOJA: 1 DE 1
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: GASTO CORRIENTE	Nº DE CONTRATO: GC-07-19
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019	
META 5631.36 M2		FECHA: 2 DE AGOSTO DEL 2019	

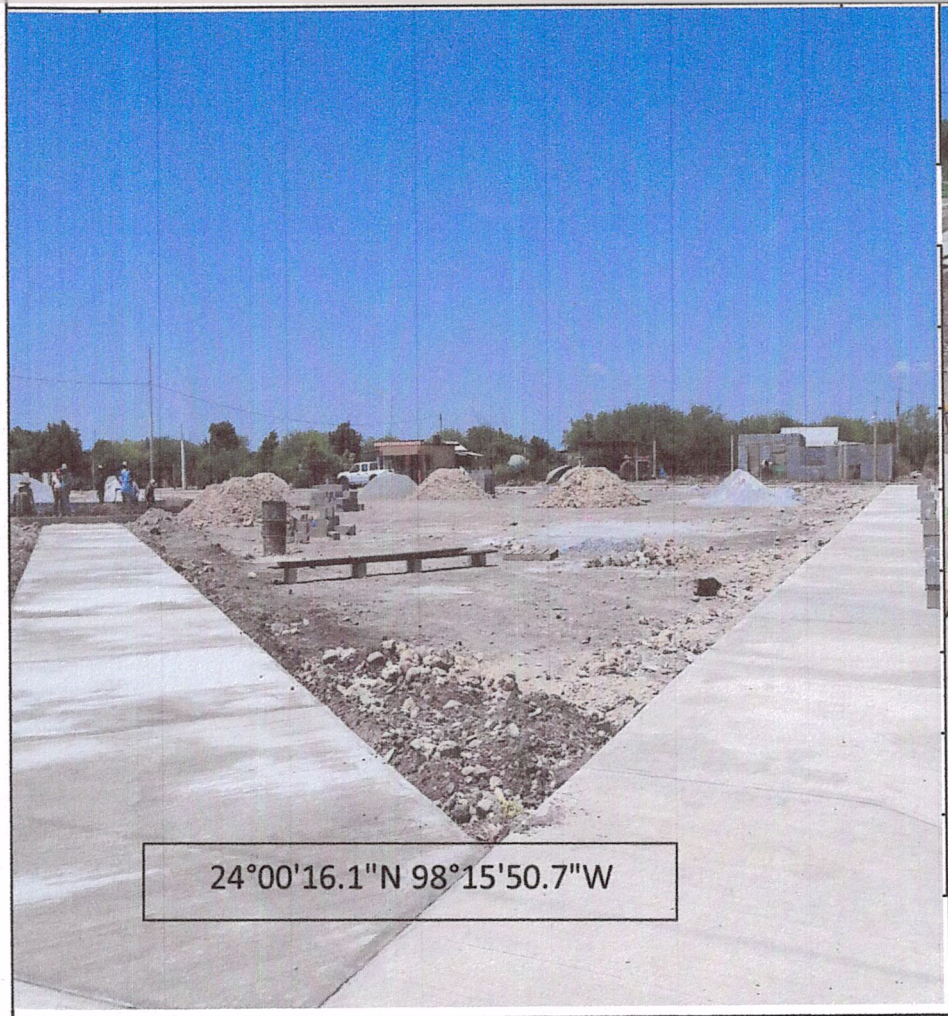

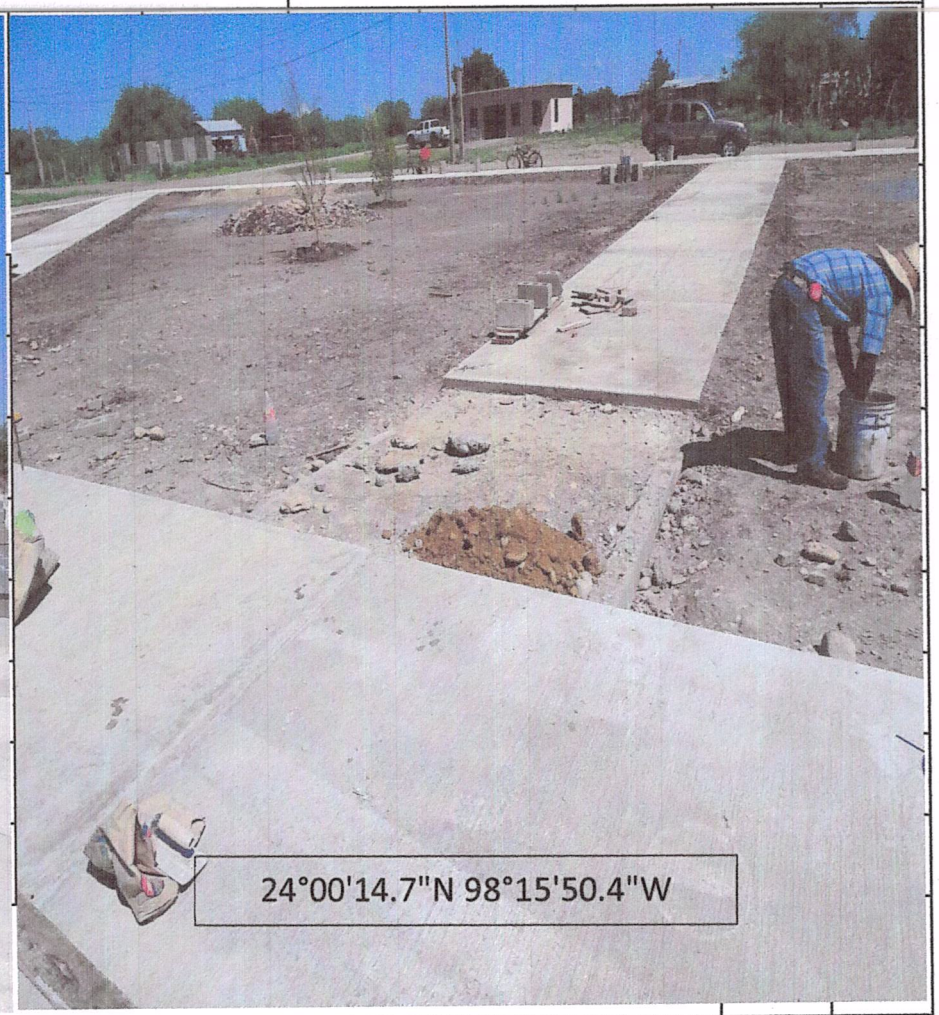

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
CONTRATISTA	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 1 HOJA: 1 DE 1
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: GASTO CORRIENTE	Nº DE CONTRATO: GC-07-19
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019	
META 5631.36 M2		FECHA: 2 DE AGOSTO DEL 2019	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ CONTRATISTA	ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA Lorenzo Antonio Alvarez Z. SUPERVISOR


MUNICIPIO DE ABASOLO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS


FOTOGRAFIA


CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 1 HOJA: 1 DE 1
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: GASTO CORRIENTE	Nº DE CONTRATO: GC-07-19
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019	
META 5631.36 M2		FECHA: 2 DE AGOSTO DEL 2019	

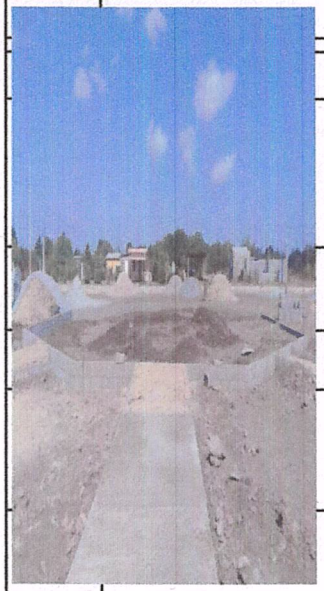

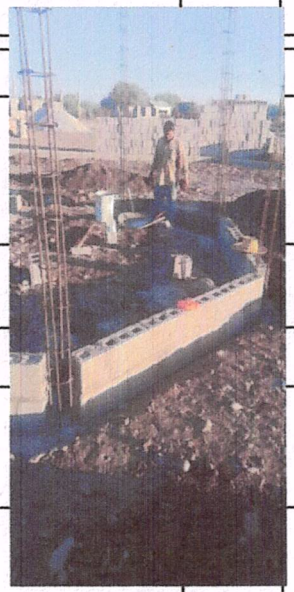








ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ CONTRATISTA	ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACION 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

TAM TAMAULIPAS

R E C I B O

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO:** ABASOLO, TAM.	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO**
CONTRATISTA:	**ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ**		
DOMICILIO:Calle LAZARO CARDENAS NUM. 410 ENTRE FLORES MAGON Y CANALES COL. DOCTORES CP. 87024., en Ciudad Victoria, Tam.,			**30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

R.F.C.	PADRON DE CONTR	IMP. DEL CONTRATO	BUENO POR:
VIOA 690102SU2		$ 1,494,138.92	$ 1,494,138.92
RECIBÍ DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO:		**$ 271,371.58**	**FECHAS DE EJECUCION**
(DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)			**DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.:	**TRABAJOS DE:**	**CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.**
1 (UNICA)	**EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:**	

ANTICIPOS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE	**$386,415.23**	**$61,826.44**	**$448,241.67**
AMORTIZACION ANTERI	**$128,805.07**	**$20,608.81**	**$149,413.88**
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00
ESTA ESTIMACION	**$257,610.16**	**$41,217.63**	**$298,827.79**
SALDO POR AMORTIZAR	$0.00	$0.00	$0.00

D E D U C C I O N E S		
0.10% RETENCION	$	494.11
0,50% SECODAM:	$	2,470.53
TOTAL DE DEDUCCIONES	$	2,964.64

MONTO ASIGNADO	$		1,494,138.92
PAGOS ANTERIORES	$		1,219,802.70
SUB-TOTAL	$		274,336.22
IMPORTE DE LA ESTIMACION	$	494,106.90	
AMORTIZACION DE ANTICIPO	$	257,610.16	
SUB-TOTAL	$	236,496.74	
I.V.A.	$	37,839.48	
TOTAL	$	274,336.22	$ 274,336.22

AVANCES			PENA CONVENCIONAL
	FISICO	FINANCIERO	ACUM. ANTERIOR
PROGRAMADO %	100%	100%	ACTUAL
ESTIMADO %	100%	100%	DEVOLUCION $
			POR APLICAR $

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES	$	2,964.64
NETO A PAGAR	$	271,371.58
SALDO DE ASIGNACION		$0.00

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ**	**C. MARTIN CASTILLO TORRES**	**LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA**
CONTRATISTA	**DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANPO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**SECRETARIO**	**CONTRALOR**

R. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ABASOLO, TAM.
OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2018 - 2021

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

ESTIMACION

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO
HOJA: 1 DE 3

LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO | **MUNICIPIO: ABASOLO, TAM** | **RAMO: GASTO CORRIENTE** | **Nº DE CONTRATO: GC-07-19**

CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ | **PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**

META 5631.36 M2 | **FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. ($)	VOLUMEN					IMPORTE ($)
				PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
1	CONSTRUCCION DE BANCAS DE BLOCK Y CONCRETO de 2.00 x 0.40 INCLUYE MATERIALES Y MANO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	$ 476.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	$ 11,424.00
8	BANQUETA DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 EN ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE RELLENO ,EXCAVACION Y NIVELACION ,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. A= PERIMETRO-APOTEMA/2	M2	$ 368.50	1602.5	1468.71	133.79	1602.50	0.00	$ 49,302.11
9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION , RELLENO, Y ROTURA DE CONCRETO NESESARIA.	ML	$ 68.20	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	$ 20,460.00
10	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 12 INCL. CINTA AISLANTE	ML	$ 24.50	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	$ 22,050.00
11	SUMINISTRO, Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. DE 0.40X0.40X 0.80 M. DE ALTURA,ARMADO CON 4 VRS. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: todo lo necesario y la preparacion para la conexión a la red electrica.	PZA	$ 1,360.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	$ 10,880.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CILINDRICO DE 1/4 CED. 30 CON SOPORTE PARA ARBOTANTE DE 1.50 ML. , METALICO ACABADO ANTICORROSIVO CON PUNTA POSTE DE 5.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: PLACA BASE DE 3/8" DE 30X30 ANCLAS CON PREPARACION PARA 4 ESPARRAGOS DE 5/8 INCLUYE TODO LO NESESARIO PARA SU INSTALACION, NIVELADO, PLOMEADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA	PZA	$ 5,720.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	$ 45,760.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PUNTA POSTE DIEU Y EQUIPO LED DE 60 W, DEL TIPO AHORRADOR INCLUYE: DIFUSOR, BALASTRO, FOCO AHORRADOR, CABLE DEL No 12 Y CONEXIONES MENORES.	PZA	$ 5,610.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	$ 89,760.00
14	SUMINISTRO, Y COLOCACION DE REGISTRO DE 30 X 30X 30 DE BLOCK DE 10 X20X40 CON TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 INCLUYE:, EXCAVACION, RELLENO .	PZA	$ 620.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	$ 5,580.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LAMPARAS COLOCADO EN ACOMETIDA DE CONCRETO ARMADO DE SECCION DE 0.15 X 0.70 M. EN 3.00M. DE ALTURA, INCLUYE: CORTADOR,TUBOS GALVANIZADOS, CABLEADOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA	PZA	$ 15,274.24	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	$ 15,274.24
16	DESMANTELAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y SU REHABILITACION INCLUYE EXCAVACION,CARGA ,FLETES ACARREOS,RETIRO,REPARACION,SOLDADURAS,LIMPIEZA,PINTURA,E INSTALACION PARA SEGURIDAD Y CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	$ 2,970.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	$ 17,820.00
								SUBTOTAL	$ 288,310.35
								TOTAL	$ 494,106.89

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
CONTRATISTA	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

ESTIMACION

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO
HOJA: 2 DE 3

LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO | **MUNICIPIO: ABASOLO, TAM** | **RAMO: GASTO CORRIENTE** | **Nº DE CONTRATO: GC-07-19**

CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ

PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019

META 5631.36 M2

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. ($)	PRESUPUESTO	VOLUMEN ACUM. ANT.	VOLUMEN PRESENTE	VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN EXCEDENTE	IMPORTE ($)
17	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL TIPO LAUREL DE LA INDIA DE 3.00 ML. DE ALTURA INCLUYE UBICACIÓN,EXCAVACION DE CEPAS ,RIEGO MANUAL POR 15 DIAS ,FLETES Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACION.	PZA	$ 376.96	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	$ 6,031.40
18	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PASTO BUFEL, INCLUYE RIEGO LOS PRIMEROS 15 DIAS PARA SU CRECIMIENTO NATURAL,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	$ 7.20	3679.92	0.00	3679.92	3679.92	0.00	$ 26,495.42
19	TRAZO Y NIVELACION DE AREA	M2	$ 5.65	100	0.00	100.00	100.00	0.00	$ 565.00
20	EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA EN CIMENTACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION		$ 208.23	18.3552	0.00	18.36	18.36	0.00	$ 3,822.10
21	PLANTILLA DE CONCRETO FC 150 KGS/CM2	M2	$ 227.52	16.576	0.00	16.58	16.58	0.00	$ 3,771.37
22	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 20 CMS. DE ESPESOR CON VRS. DE 1/2 A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO FC 150 KGS./CM2 Y DADO DE 30 X	M3	$ 3,350.00	3.0624	0.00	3.06	3.06	0.00	$ 10,259.04
23	DALA DE CERRAMIENTO DE CERRAMIENTO DE 15 X 25 CON 6 VRS. DE 3/8 Y ESTRIBOS A CADA 20 CMS. CON CONCRETO FC 200 KGS/CM2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	$ 468.00	37.12	0.00	37.12	37.12	0.00	$ 17,372.16
24	CASTILLO DE CONCRETO FC 150 KGS/CM2 ARMADA CON 4 VRS.. DE 3/8 CON ESTRIBOS A CADA 20 CMS. DEL NUM. 3 INCLUYE CIMBRA Y DESIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	$ 362.00	9.6	0.00	9.60	9.60	0.00	$ 3,475.20
25	COLUMNA DE CONCRETO FC 200KG/CM2 DE 30 CMS. DE DIAMETRO ARMADA CON 6 VRS. DE 1/2 Y ESTRIBOS A CADA 20 CMS. DEL NUM2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION CIMBRA Y DECIMBRA. INCLUYE CIMBRA Y DESIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	$ 576.00	19.2	0.00	19.20	19.20	0.00	$ 11,059.20
26	MURO DE ENRASE DE CIMENTACION CON BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO POBRE DE 100 KG/CM2 ASENTADO CON MORETERO CEMENTO ARENA 1 -5	M2	$ 398.00	31.892	0.00	31.89	31.89	0.00	$ 12,693.02
								SUBTOTAL	$ 95,543.91

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

E S T I M A C I O N

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO HOJA: 3 DE 3
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: GASTO CORRIENTE	Nº DE CONTRATO: GC-07-19
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019	
META 5631.36 M2		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. ($)	PRESUPUESTO	VOLUMEN ACUM. ANT.	VOLUMEN PRESENTE	VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN EXCEDENTE	IMPORTE ($)
27	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO PARA CONSTRUCCION DE NIVEL DE KIOSCO,INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTAS NESESARIAS MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	$ 138.00	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	$ 4,692.00
28	CONSTRUCCION DE LOSA ARMADA DE CONCRETO FC 200 KGS. /CM2 CON DOBLE EMPARRILLADO DE 20X20 CON VARILLA DE 3/8 INCLUYE CIMBRA, ARMADO Y COLADO ,MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	$ 1,235.00	40.69	0.00	40.69	40.69	0.00	$ 50,252.15
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE POLIESTIRENO DE 20 CM	ML	$ 362.00	22.40	0.00	22.40	22.40	0.00	$ 8,108.80
30	IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN APLICACION DE 3 CAPAS DE TERMOTEX O SIMILAR DE 5 AÑOS REFORZADO CON MALLA SEGUN ESPESIFICACIONES INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE SELLADO DE GRIETAS MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	$ 136.00	40.69	0.00	40.69	40.69	0.00	$ 5,533.84
31	APLICACIÓN DE ESTUCO EN LOSA DE KIOSCO INCLUYE MATERIALES ,ANDAMIOS HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	$ 188.00	40.69	0.00	40.69	40.69	0.00	$ 7,649.72
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL DE 90 CMS. DE ALTURA EN KIOSCO Y ESCALERA INCLUYE PINTURA INSTALACION Y MANO DE OBRA	M2	$ 1,195.00	21.72	0.00	21.72	21.72	0.00	$ 25,955.40
33	APLANADO DE MEZCLA EN EXTERIOR PERIMETRAL INFERIOR DE KIOSCO	M2	$ 136.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	$ 2,720.00
34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA EN MUROS Y LOSA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	$ 88.00	60.69	0.00	60.69	60.69	0.00	$ 5,340.72
								SUBTOTAL	$ 110,252.63

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
CONTRATISTA	SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

GENERADORES

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO HOJA: 1 DE 3
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: GASTO CORRIENTE	Nº DE CONTRATO: GC-07-19
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019	
META 5631.36 M2		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD		PRESUPUESTO	VOLUMEN ACUM. ANT.	VOLUMEN PRESENTE	VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN EXCEDENTE	
1	CONSTRUCCION DE BANCAS DE BLOCK Y CONCRETO de 2.00 x 0.40 INCLUYE MATERIALES Y MANO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA		24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	
8	BANQUETA DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 EN ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE RELLENO ,EXCAVACION Y NIVELACION ,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. A= PERIMETRO-APOTEMA/2	M2		1468.70	1468.71	133.79	1602.50	0.00	
9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION , RELLENO, Y ROTURA DE CONCRETO NESESARIA.	ml				300.00			300.00
10	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 10 INCL. CINTA AISLANTE	ml				600.00			600.00
11	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 12 INCL. CINTA AISLANTE	ml				300.00			300.00
12	SUMINISTRO, Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. DE 0.40X0.40X 0.80 M. DE ALTURA,ARMADO CON 4 VRS. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: todo lo necesario y la preparacion para la conexión a la red electrica.	pieza				12.00			12.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CILINDRICO DE 1/4 CED. 30 CON SOPORTE PARA ARBOTANTE DE 1.50 ML. , METALICO ACABADO ANTICORROSIVO CON PUNTA POSTE DE 5.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: PLACA BASE DE 3/8" DE 30X30 ANCLAS CON PREPARACION PARA 4 ESPARRAGOS DE 5/8 INCLUYE TODO LO NESESARIO PARA SU INSTALACION, NIVELADO, PLOMEADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA	pieza				12.00			12.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PUNTA POSTE DIEU Y EQUIPO LED DE 60 W, DEL TIPO AHORRADOR INCLUYE: DIFUSOR, BALASTRO, FOCO AHORRADOR, CABLE DEL No 12 Y CONEXIONES MENORES.	pieza				8.00			12.00

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
Lorenzo A. Alvarez Z.
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

GENERADORES

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. | **ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO HOJA: 2 DE 3**

LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO | **MUNICIPIO: ABASOLO, TAM** | **RAMO: GASTO CORRIENTE** | **Nº DE CONTRATO: GC-07-19**

CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ | **PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**

META 5631.36 M2 | **FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

15	SUMINISTRO, Y COLOCACION DE REGISTRO DE 40 X 40X 40 DE BLOCK CON TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 INCLUYE:, EXCAVACION, RELLENO .	pieza						9.00				12.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LAMPARAS COLOCADO EN ACOMETIDA DE CONCRETO ARMADO DE SECCION DE 0.25X.20 M. EN 3.00M. DE ALTURA, INCLUYE: GABINETE, UNIDADES TERMOMAGNETICAS,TUBOS GALVANIZADOS, CABLEADOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA	pieza						1.00				1.00
17	DESMANTELAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y SU REHABILITACION INCLUYE EXCAVACION,CARGA ,FLETES ACARREOS,RETIRO,REPARACION,SOLDADURAS,LIMPIEZA,PINTURA,E INSTALACION PARA SEGURIDAD Y CORRECTA OPERACIÓN.	PZA										6.00
18	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL TIPO LAUREL DE LA INDIA DE 3.00 ML. DE ALTURA INCLUYE UBICACIÓN,EXCAVACION DE CEPAS ,RIEGO MANUAL POR 15 DIAS ,FLETES Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACION.	PZA										16.00
19	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PASTO BUFEL, INCLUYE RIEGO LOS PRIMEROS 15 DIAS PARA SU CRECIMIENTO NATURAL,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2						3813.72				3813.7
20	TRAZO Y NIVELACION DE AREA	M2				1	10.00	10.00	100.00			100.00
21	EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA EN CIMENTACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M3	ZC 1 A 8	2.29	0.8	1.20	8.00	17.59				
			ESCALERA	1.7	0.4	0.40	2.00	0.54				
				1.4	0.4	0.40	1.00	0.22				
								18.36				18.36
22	PLANTILLA DE CONCRETO FC 150 KGS/CM2	M2	ZC 1 A 8	2.29	0.8	1.00	8.00	14.66				
			ESCALERA	1.7	0.4	1.00	2.00	1.36				
				1.4	0.4	1.00	1.00	0.56				
								16.58				16.58
23	CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 20 CMS. DE ESPESOR CON VRS. DE 1/2 A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO FC 150 KGS./CM2 Y DADO DE 30 X 30 CON 6 VRS. DE 1/2 CON ESTRIBOS A CADA 20 CMS.	M3	ZC 1 A 8	2.29	0.8	0.15	8.00	2.20				
			DC DEL 1 AL 8	0.3	0.3	1.20	8.00	0.86				
								3.06				3.06
24	DALA DE CERRAMIENTO DE CERRAMIENTO DE 15 X 25 CON 6 VRS. DE 3/8 Y ESTRIBOS A CADA 20 CMS. CON CONCRETO FC 200 KGS/CM2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML.	BASE CD DEL 1 AL 8	2.32			8.00	18.56				
			SUPERIOR CD DEL 1 AL 8	2.32			8.00	18.56				
								37.12				37.12
25	CASTILLO DE CONCRETO FC 150 KGS/CM2 ARMADA CON 4 VRS.. DE 3/8 CON ESTRIBOS A CADA 20 CMS. DEL NUM. 3 INCLUYE CIMBRA Y DESIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	COLUMNA K1 DEL 1 AL 8	1.2			8	9.60				9.60

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
Lorenzo A. Alvarez Z.
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

GENERADORES

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.												ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO HOJA: 3 DE 3
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO			MUNICIPIO: ABASOLO, TAM				RAMO: GASTO CORRIENTE				Nº DE CONTRATO: GC-07-19	
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ							PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019					
META 5631.36 M2							FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019					
26	COLUMNA DE CONCRETO FC 200KG/CM2 DE 30 CMS. DE DIAMETRO ARMADA CON 6 VRS. DE 1/2 Y ESTRIBOS A CADA 20 CMS. DEL NUM2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION CIMBRA Y DECIMBRA. INCLUYE CIMBRA Y DESIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	COLUMNA DC DEL 1 AL 8	2.4			8	19.20			19.20
27	MURO DE ENRASE DE CIMENTACION CON BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO POBRE DE 100 KG/CM2 ASENTADO CON MORETERO CEMENTO ARENA 1 -5	M2	MUROS ENTRE EJES	2.07	1.70		8	28.15			
			MURO ESCALERA	1.50	1.00		2	3.00			
			MURO ESCALERA	1.85	0.40		1	0.74			
								31.89			31.89
28	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO PARA CONSTRUCCION DE NIVEL DE KIOSCO,INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTAS NESESARIAS MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	AREA .785X36=28.26X1.15=32.50				1	32.50			
				1.35	1.85	0.6	1	1.50			
								34.00			34.00
29	CONSTRUCCION DE LOSA ARMADA DE CONCRETO FC 200 KGS. /CM2 CON DOBLE EMPARRILLADO DE 20X20 CON VARILLA DE 3/8 INCLUYE CIMBRA, ARMADO Y COLADO ,MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	LOSA		0.785x(7.2x7.2)=40.69			1.00	M2	40.69		40.69
30	SUMINISTRO Y COLOC DE MOLDURA DE POLIESTIRENO DE 20 CM			2.8			8	ML	22.4		22.4
31	IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN APLICACION DE 3 CAPAS DE TERMOTEX O SIMILAR DE 5 AÑOS REFORZADO CON MALLA SEGUN ESPESIFICACIONES INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE SELLADO DE GRIETAS MATERIALES Y MANO DE OBRA	LOSA	0.785x(7.2x7.2)=40.69				1.00	M2	40.69		40.69
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL DE 90 CMS. DE ALTURA EN KIOSCO Y ESCALERA INCLUYE PINTURA INSTALACION Y MANO DE OBRA	2.29	1	1.00	8.00			18.32				
		1.7	1.8	1.00	2.00			3.40				
								21.72	M2			21.72
33	APLANADO DE MEZCLA EN EXTERIOR PERIMETRAL INFERIOR DE KIOSCO	2.5	1	1.00	8.00			20.00	M2			20.00
34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA EN MUROS Y LOSA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	KIOSCO						20.00				
		LOSA						40.69				
								60.69	M2			60.69

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR


MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

CROQUIS

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO HOJA: 1 DE 4
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: GASTO CORRIENTE	Nº DE CONTRATO: GC-07-19
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019	
META 5631.36 M2		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	

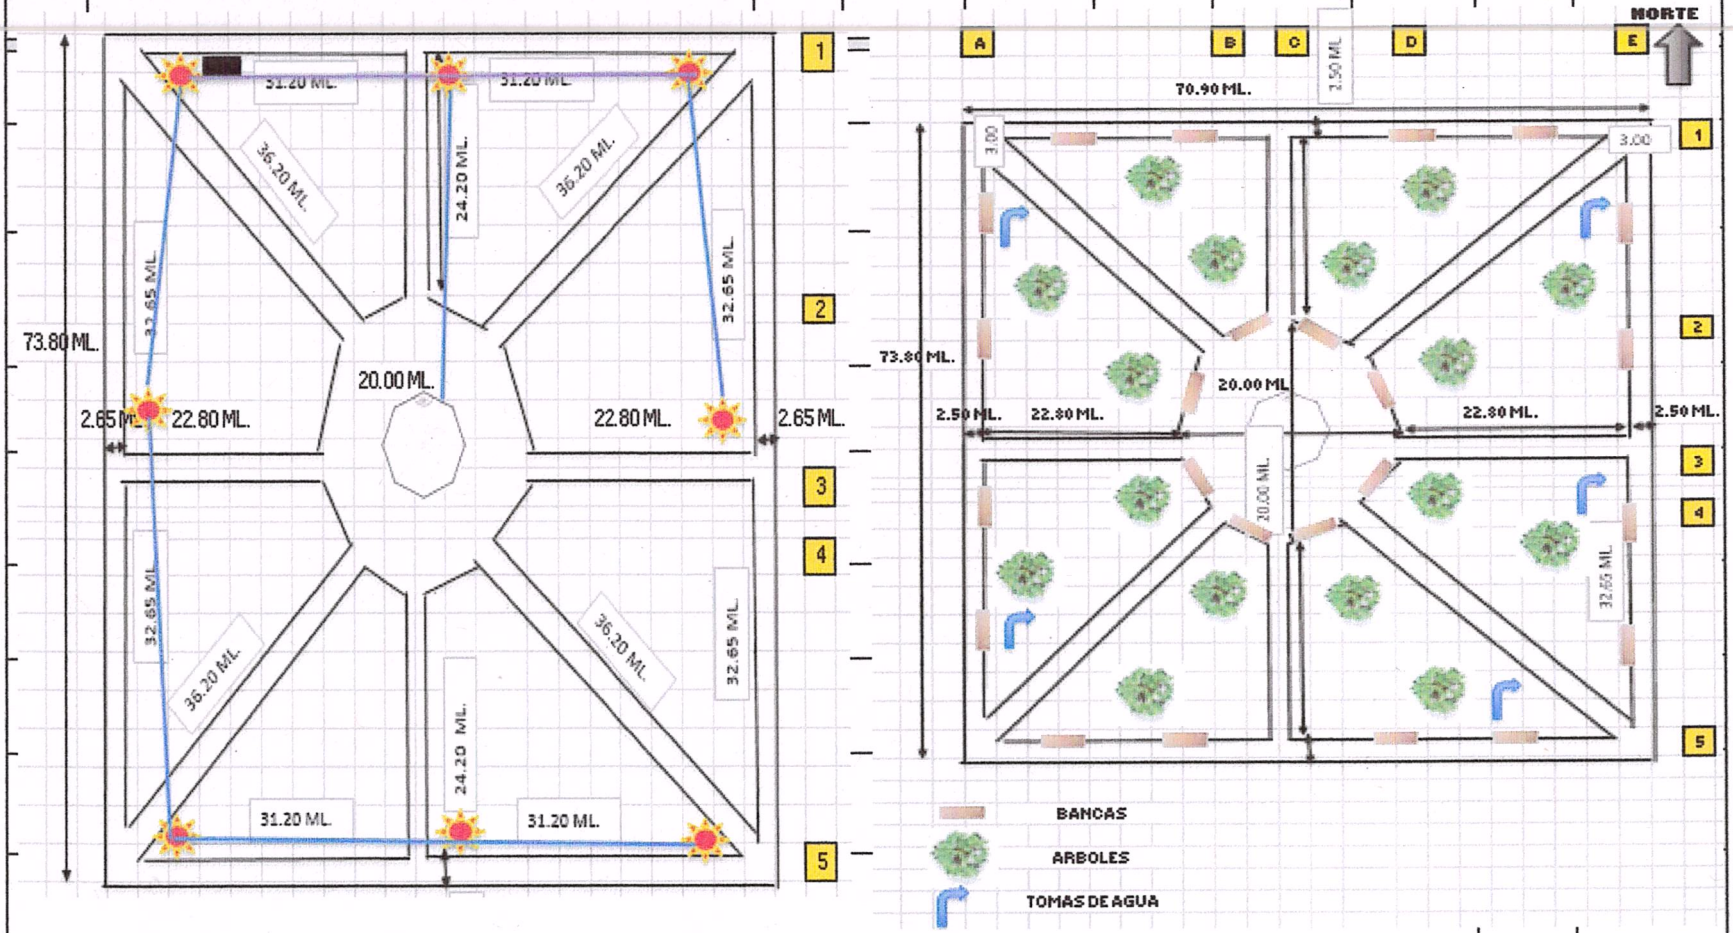

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ CONTRATISTA	ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA SUPERVISOR


MUNICIPIO DE ABASOLO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021


TAM TAMAULIPAS

CROQUIS

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO HOJA: 2 DE 4**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	

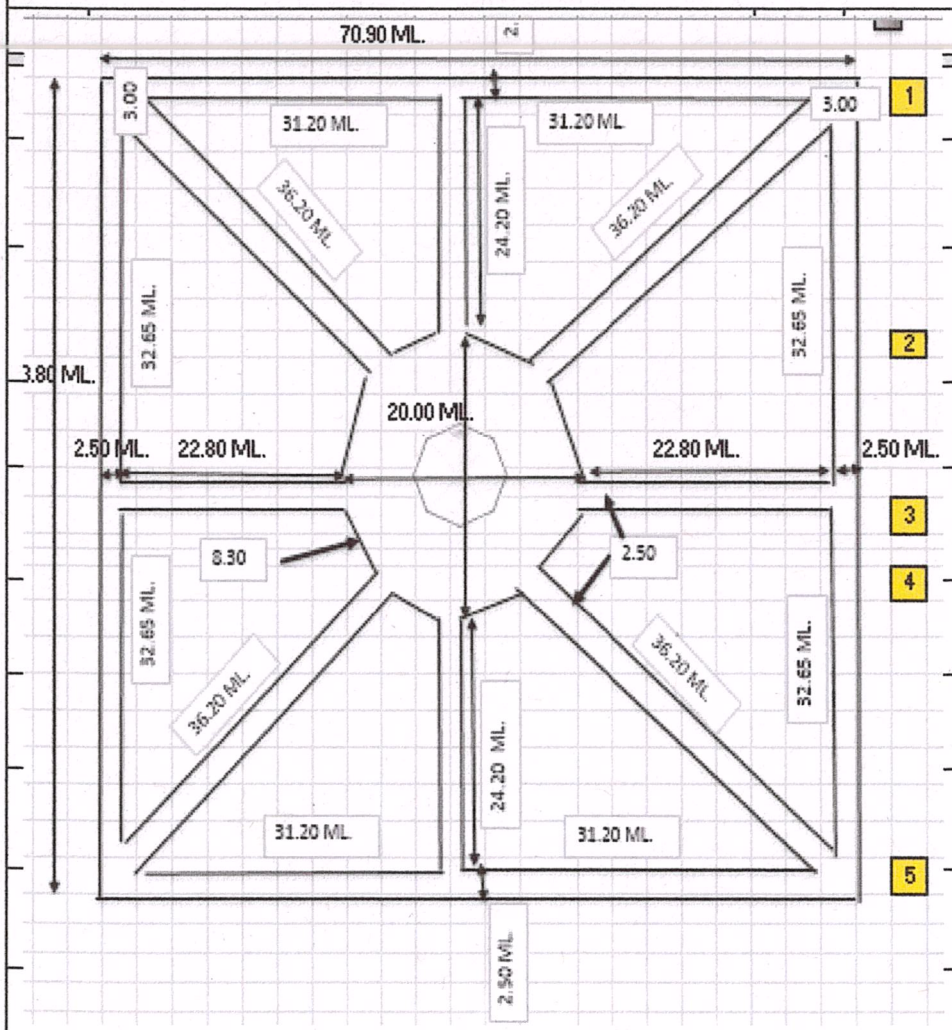

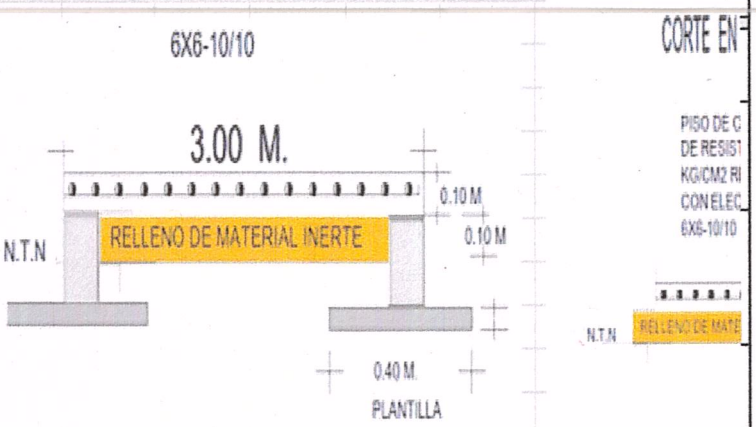

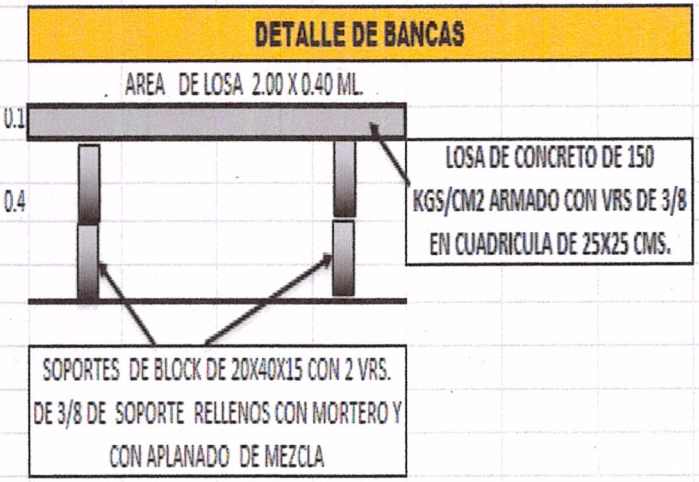

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA**
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**


MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

CROQUIS

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO HOJA: 3 DE 4**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	

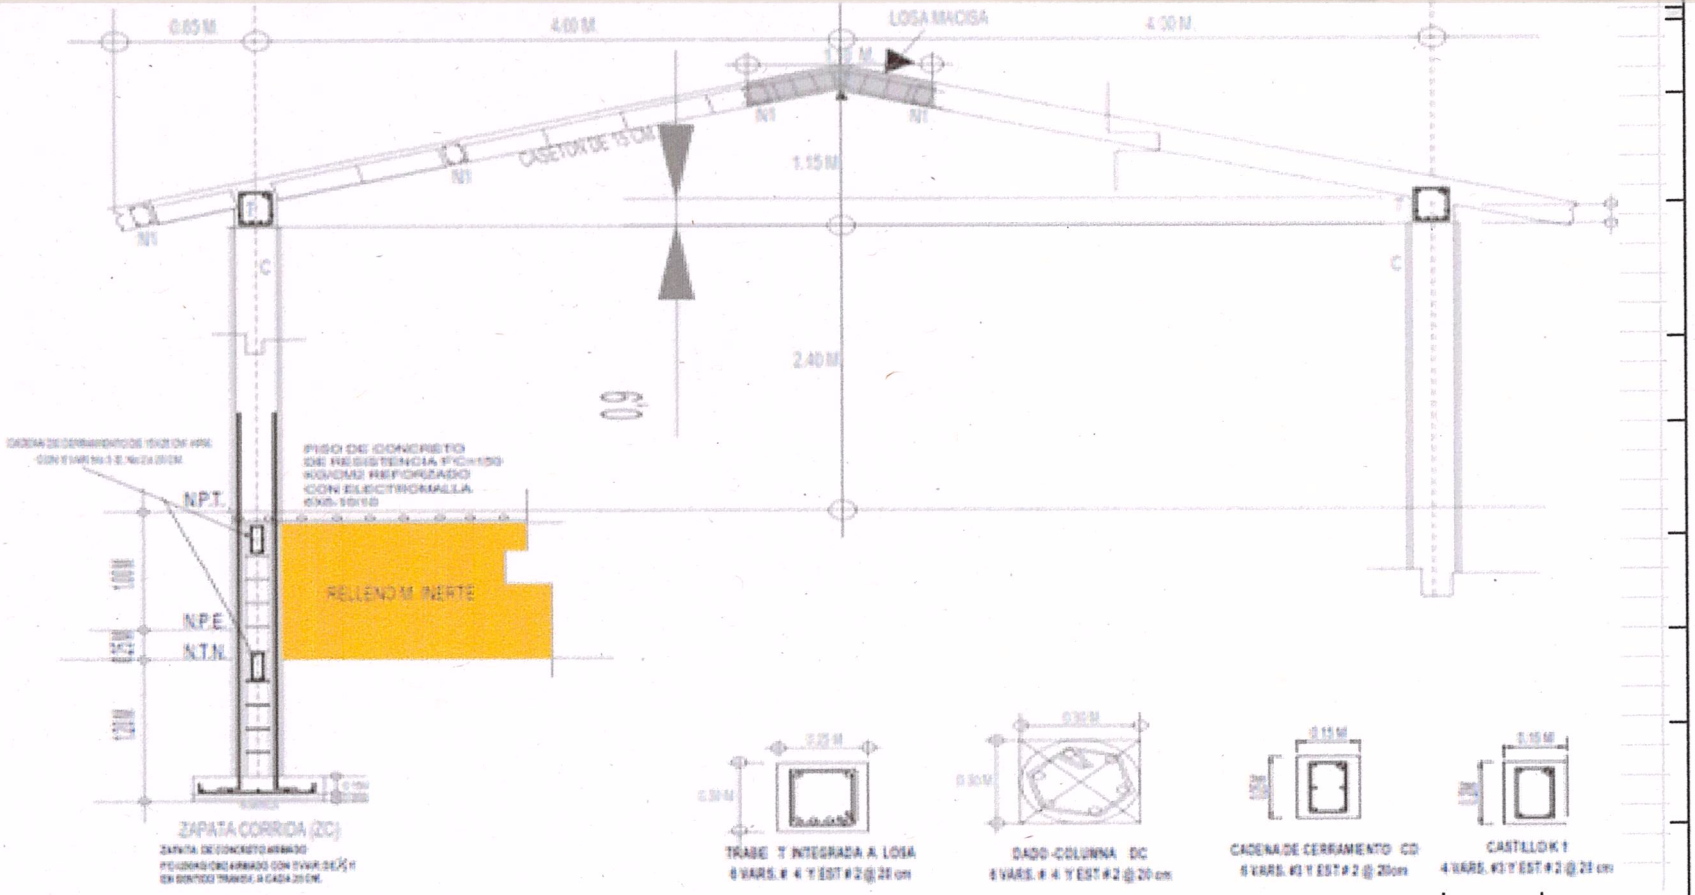

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA**
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**


MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021


TAM TAMAULIPAS


CROQUIS


CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO HOJA: 4 DE 4**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	

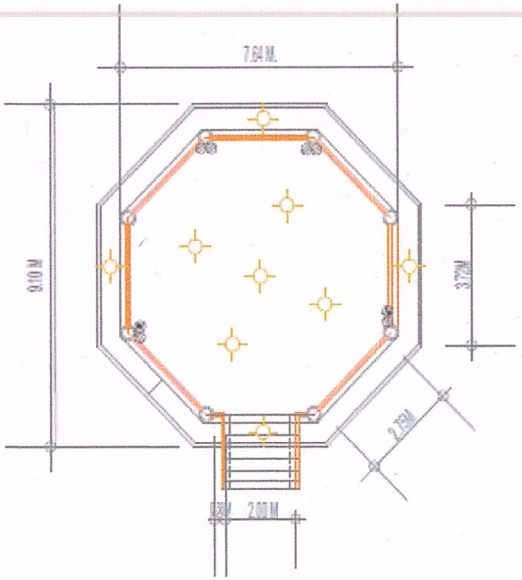


ELEVACION

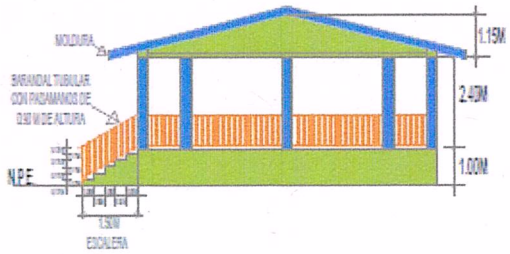

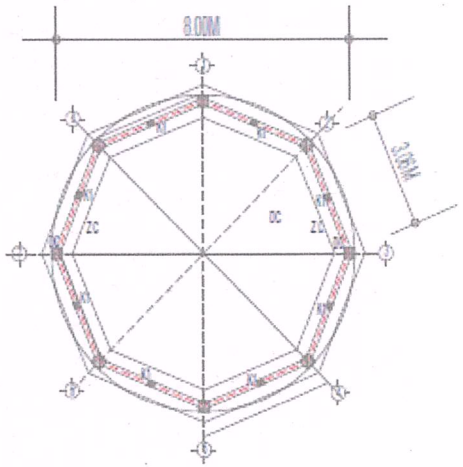

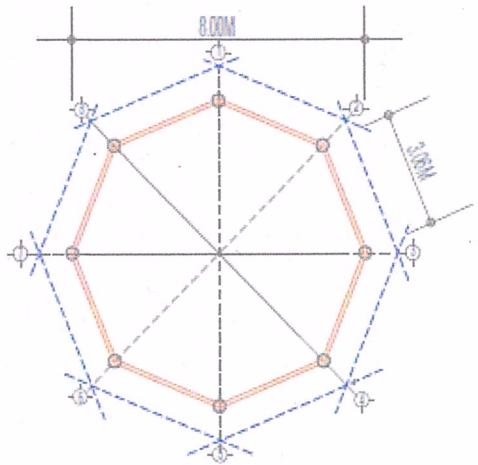

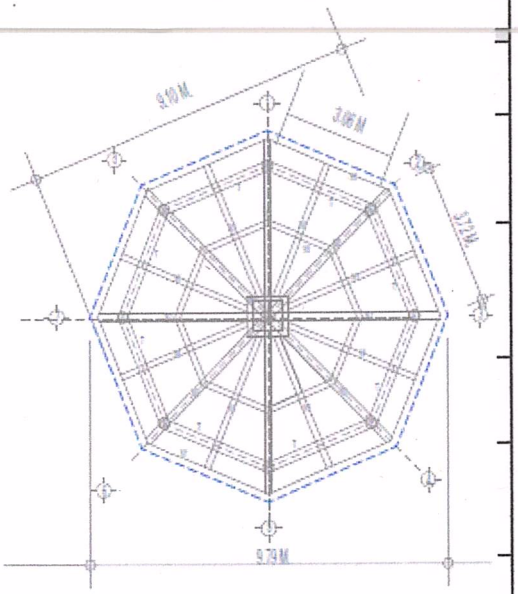

LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2. CON NERVADURAS Y TRABES, REFORZADO CON ELECTROMALLA 6X6-10/10

N1=NERVADURA DE 0.15X0.20M. ARMADA CON 4 VR. DE 3/8", Y ANILLOS DE ALAMBRON A.C. 20 CM.

N2=NERVADURA DE 0.20X0.20M. ARMADA CON 4 VR. DE 1/2", Y ANILLOS DE ALAMBRON A.C. 20 CM.

T=TRABE DE 0.25X0.30M. ARMADA CON 6 VR. DE 1/2", Y ANILLOS DE ALAMBRON A.C. 20 CM.

R.

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA**
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: GASTO CORRIENTE	Nº DE CONTRATO: GC-07-19
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019	
META 5631.36 M2		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA**
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**

Lorenzo Antonio Alvarez Z.

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA**
CONTRATISTA	Lorenzo Antonio Alvarez **SUPERVISOR**

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA**
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**

Lorenzo Antonio Alvarez Z.

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA**
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA**
Alfredo Vidales Ortiz	Lorenzo Antonio Alvarez Z.
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
CONTRATISTA

Ing. Arturo Alvarez T.
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
CONTRATISTA

Lorenzo Antonio Alvarez Z.
ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO HOJA: 1 DE 2**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA**
CONTRATISTA	Lorenzo Antonio Alvarez Z. SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO HOJA: 1 DE 2**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA**
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**

Lorenzo Antonio Alvarez Z.

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA**
CONTRATISTA	SUPERVISOR

Lorenzo Antonio Alvarez Z.

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA**
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	





ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA**
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021


TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	





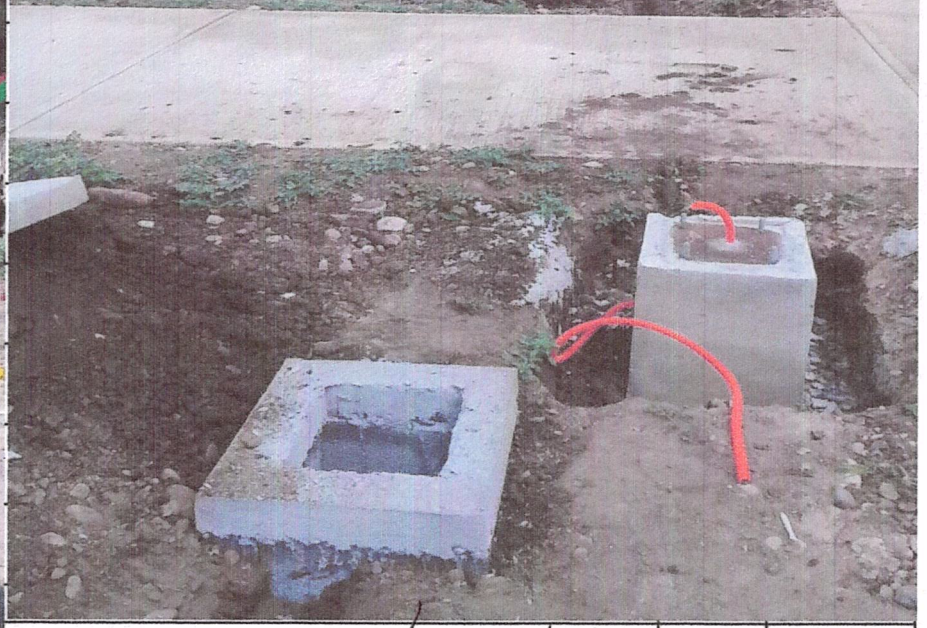

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	**ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA**
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			**ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO HOJA: 1 DE 2**
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	**MUNICIPIO: ABASOLO, TAM**	**RAMO: GASTO CORRIENTE**	**Nº DE CONTRATO: GC-07-19**
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		**PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019**	
META 5631.36 M2		**FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**	



ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE ABASOLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TAM TAMAULIPAS

FOTOGRAFIA

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UNA AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			ESTIMACION: No. 2 FINIQUITO HOJA: 2 DE 2
LOCALIDAD: COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: GASTO CORRIENTE	Nº DE CONTRATO: GC-07-19
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ		PERIODO DE EJECUCION : DEL 16 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019	
META 5631.36 M2		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	














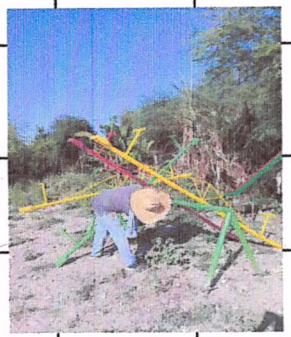

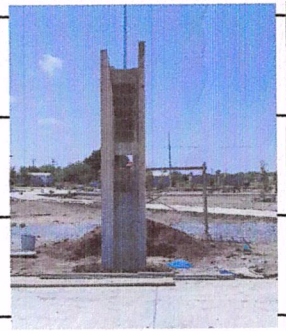

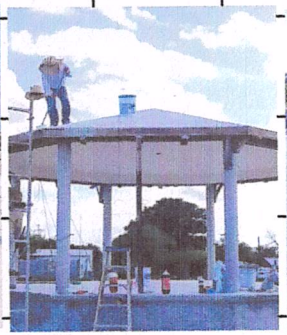ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
SUPERVISOR

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO N.º: GC-07-19

FECHA: 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DATOS GENERALES:

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA EN UN AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL NCP. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PLAZO DE EJECUCION: DEL 16 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
CONTRATISTA: ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
DOMICILIO FISCAL: CALLE LAZARO CARDENAS NUM. 410 ENTRE FLORES MAGON Y CANALES COL. DOCTORES EN CD VICTORIA TAM. C.P.87024
R.F.C.: VIOA690102SU2

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 31 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA** EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL **ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

ESTABLECIENDO EN CASO DE EXISTIR UNA MALA CALIDAD O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARARLOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.

UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS QUEDANDO DE CONFORMIDAD:

ENTREGA:

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

RECIBE:

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. GC-07-19

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

EN **ABASOLO TAM.** SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **30** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL DIECINUEVE.** EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"LA CONTRATANTE"**: REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA.** PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA.** CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL **C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ. DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** DE OBRAS PUBLICAS **Y** POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ**

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE **"LA CONTRATANTE"** DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UN AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL NCP. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. GC-07-19

	CONSTRUCCION DE BANCAS DE BLOCK Y CONCRETO de 2.00 x 0.40 INCLUYE MATERIALES Y MANO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	24
	TRAZO Y NIVELACION DE AREA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 73.80 X70.90 QUE COMPRENDE: LOCALIZACION GENERAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ASI COM EXPLANADA , TRAZO, ALINEAMIENTO, BANCOS DE REFERENCIA Y NIVELES PARA EL DESPLANTE DE LA OBRA, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	5232.42
	EXCAVACION CON MOTOCONFORMADORA DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO Y MALEZA	M2	5232.42
	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	166.405
	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 DE 15X20X40 INCLUYE MANO DE OBRA,FORMAS,MANIOBRA DE TRANSPORTE Y CAMBIO DE FORMAS, EXCAVACION,MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	289.4
	PLANTILLA DE DESPLANTE PARA CONSTRUCCION DE RODAPIE DE BLOCK EN ANDADORES DE 6 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 100KGS/CM2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	319.76
	RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40 2 HILADAS RELLENO CON CONCRETO FC 100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1 4 ,INCLUYE MATERIALLES HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	99.86
	BANQUETA DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 EN ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE RELLENO ,EXCAVACION Y NIVELACION ,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. A= PERIMETRO-APOTEMA/2	M2	1602.5
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION , RELLENO, Y ROTURA DE CONCRETO NESESARIA.	ML	300.00
	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 12 INCL. CINTA AISLANTE	ML	900.00
	SUMINISTRO, Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. DE 0.40X0.40X 0.80 M. DE ALTURA,ARMADO CON 4 VRS. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: todo lo necesario y la preparacion para la conexión a la red electrica.	PZA	8.00

ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. GC-07-19

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CILINDRICO DE 1/4 CED. 30 CON SOPORTE PARA ARBOTANTE DE 1.50 ML. , METALICO ACABADO ANTICORROSIVO CON PUNTA POSTE DE 5.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: PLACA BASE DE 3/8" DE 30X30 ANCLAS CON PREPARACION PARA 4 ESPARRAGOS DE 5/8 INCLUYE TODO LO NESESARIO PARA SU INSTALACION, NIVELADO, PLOMEADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA,	PZA	8.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PUNTA POSTE DIEU Y EQUIPO LED DE 60 W, DEL TIPO AHORRADOR INCLUYE: DIFUSOR, BALASTRO, FOCO AHORRADOR, CABLE DEL No 12 Y CONEXIONES MENORES.	PZA	16.00	
SUMINISTRO, Y COLOCACION DE REGISTRO DE 30 X 30X 30 DE BLOCK DE 10 X20X40 CON TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 INCLUYE:, EXCAVACION, RELLENO .	PZA	9.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LAMPARAS COLOCADO EN ACOMETIDA DE CONCRETO ARMADO DE SECCION DE 0.15 X 0.70 M. EN 3.00M. DE ALTURA, INCLUYE: CORTADOR,TUBOS GALVANIZADOS, CABLEADOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	
DESMANTELAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y SU REHABILITACION INCLUYE EXCAVACION,CARGA ,FLETES ACARREOS,RETIRO,REPARACION,SOLDADURAS,LIMPIEZA,PINTURA,E INSTALACION PARA SEGURIDAD Y CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	6.00	
SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL TIPO LAUREL DE LA INDIA DE 3.00 ML. DE ALTURA INCLUYE UBICACIÓN,EXCAVACION DE CEPAS ,RIEGO MANUAL POR 15 DIAS ,FLETES Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACION.	PZA	16.00	
SUMINISTRO Y PLANTACION DE PASTO BUFEL, INCLUYE RIEGO LOS PRIMEROS 15 DIAS PARA SU CRECIMIENTO NATURAL,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	3679.92	
TRAZO Y NIVELACION DE AREA	M2	100.00	
EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA EN CIMENTACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION		18.36	
PLANTILLA DE CONCRETO FC 150 KGS/CM2	M2	16.58	
CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 20 CMS. DE ESPESOR CON VRS. DE 1/2 A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO FC 150 KGS./CM2 Y DADO DE 30 X 30 CON 6 VRS. DE 1/2 CON ESTRIBOS A CADA 20 CMS.	M3	3.06	
DALA DE CERRAMIENTO DE CERRAMIENTO DE 15 X 25 CON 6 VRS. DE 3/8 Y ESTRIBOS A CADA 20 CMS. CON CONCRETO FC 200 KGS/CM2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	37.12	
CASTILLO DE CONCRETO FC 150 KGS/CM2 ARMADA CON 4 VRS.. DE 3/8 CON ESTRIBOS A CADA 20 CMS. DEL NUM. 3 INCLUYE CIMBRA Y DESIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	9.60	

ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. GC-07-19

COLUMNA DE CONCRETO FC 200KG/CM2 DE 30 CMS. DE DIAMETRO ARMADA CON 6 VRS. DE 1/2 Y ESTRIBOS A CADA 20 CMS. DEL NUM2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION CIMBRA Y DECIMBRA. INCLUYE CIMBRA Y DESIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	19.20
MURO DE ENRASE DE CIMENTACION CON BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO POBRE DE 100 KG/CM2 ASENTADO CON MORETERO CEMENTO ARENA 1 -5	M2	31.89
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO PARA CONSTRUCCION DE NIVEL DE KIOSCO,INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTAS NESESARIAS MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	34.00
CONSTRUCCION DE LOSA ARMADA DE CONCRETO FC 200 KGS. /CM2 CON DOBLE EMPARRILLADO DE 20X20 CON VARILLA DE 3/8 INCLUYE CIMBRA, ARMADO Y COLADO ,MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	40.69
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE POLIESTIRENO DE 20 CM	ML	22.40
IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN APLICACION DE 3 CAPAS DE TERMOTEX O SIMILAR DE 5 AÑOS REFORZADO CON MALLA SEGUN ESPESIFICACIONES INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE SELLADO DE GRIETAS MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	40.69
APLICACIÓN DE ESTUCO EN LOSA DE KIOSCO INCLUYE MATERIALES ,ANDAMIOS HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	40.69
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL DE 90 CMS. DE ALTURA EN KIOSCO Y ESCALERA INCLUYE PINTURA INSTALACION Y MANO DE OBRA	M2	21.72
APLANADO DE MEZCLA EN EXTERIOR PERIMETRAL INFERIOR DE KIOSCO	M2	20.00
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA EN MUROS Y LOSA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	60.69

ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. GC-07-19

III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL **CONTRATO No. GC-07-19** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA ENTRE **"LA CONTRATANTE"** Y **"LA CONTRATISTA"**, CON UN MONTO ORIGINAL DE **$1,494,138.92 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.

IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE **90** DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **16 DE JULIO DEL 2019 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019.**

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **23 DE OCTUBRE DEL 2019** DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **90 (DIAS.)** CALENDARIO.

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE ($) S/ I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ($) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO ($) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
1	16 DE JULIO DEL 2019 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019	$739,943.89	$128,805.07	0.00	$4,736.66	AAA1666A
2	16 DE JULIO DEL 2019 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019	$494,706.90	$257,610.90	0.00	$2,964.64	BACE0415

NICIPIO DE ABASOLO

TAMAULIPAS

ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. GC-07-19

RESUMEN:

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES UNICA	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
$1,494,138.62	0.00	0.00

VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE

CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE **"LA CONTRATISTA"** Y A FAVOR DE **"LA CONTRATANTE"** DERIVADOS DEL **CONTRATO** Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO ($)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
$ 448,241.67	19A27855	DORAMA
$149,413.89	19A27858	DORAMA

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA **ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ.** MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA **30** DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL DIECINUEVE**, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

NICIPIO DE ABASOLO

TAMAULIPAS

ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. GC-07-19

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS

LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

----------FIN DEL ACTA----------

ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **GC/07/19** CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA GC-07-19

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN **ABASOLO TAM.**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL** AÑO **DOS MIL DIECINUEVE.** EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"LA CONTRATANTE"**: REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA.** PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. EL **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA** CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL **C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** DE OBRAS PUBLICAS **Y** POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ**

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE **"LA CONTRATANTE"** DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.

CONSTRUCCION DE PLAZA EN UN AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL NCP. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

CONTRATADAS QUE SE CUMPLIERON DEL 16 DE JULIO DEL 2019 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019

	CONSTRUCCION DE BANCAS DE BLOCK Y CONCRETO de 2.00 x 0.40 INCLUYE MATERIALES Y MANO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	24
	TRAZO Y NIVELACION DE AREA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 73.80 X70.90 QUE COMPRENDE: LOCALIZACION GENERAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ASI COM EXPLANADA , TRAZO, ALINEAMIENTO, BANCOS DE REFERENCIA Y NIVELES PARA EL DESPLANTE DE LA OBRA, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	5232.42
	EXCAVACION CON MOTOCONFORMADORA DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO Y MALEZA	M2	5232.42
	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	166.405
	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 DE 15X20X40 INCLUYE MANO DE OBRA,FORMAS,MANIOBRA DE TRANSPORTE Y CAMBIO DE FORMAS, EXCAVACION,MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.	ML	289.4
	PLANTILLA DE DESPLANTE PARA CONSTRUCCION DE RODAPIE DE BLOCK EN ANDADORES DE 6 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 100KGS/CM2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	319.76
	RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40 2 HILADAS RELLENO CON CONCRETO FC 100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1 4 ,INCLUYE MATERIALLES HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	99.86
	BANQUETA DE CONCRETO FC 150 KG/CM2 EN ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE RELLENO ,EXCAVACION Y NIVELACION ,HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. A= PERIMETRO-APOTEMA/2	M2	1602.5
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION , RELLENO, Y ROTURA DE CONCRETO NESESARIA.	ML	300.00
	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 12 INCL. CINTA AISLANTE	ML	900.00
	SUMINISTRO, Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. DE 0.40X0.40X 0.80 M. DE ALTURA,ARMADO CON 4 VRS. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: todo lo necesario y la preparacion para la conexión a la red electrica.	PZA	8.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CILINDRICO DE 1/4 CED. 30 CON SOPORTE PARA ARBOTANTE DE 1.50 ML. , METALICO ACABADO ANTICORROSIVO CON PUNTA POSTE DE 5.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: PLACA BASE DE 3/8" DE 30X30 ANCLAS CON PREPARACION PARA 4 ESPARRAGOS DE 5/8 INCLUYE TODO LO NESESARIO PARA SU INSTALACION, NIVELADO, PLOMEADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA,	PZA	8.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PUNTA POSTE DIEU Y EQUIPO LED DE 60 W, DEL TIPO AHORRADOR INCLUYE: DIFUSOR, BALASTRO, FOCO AHORRADOR, CABLE DEL No 12 Y CONEXIONES MENORES.	PZA	16.00
SUMINISTRO, Y COLOCACION DE REGISTRO DE 30 X 30X 30 DE BLOCK DE 10 X20X40 CON TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 INCLUYE:, EXCAVACION, RELLENO .	PZA	9.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LAMPARAS COLOCADO EN ACOMETIDA DE CONCRETO ARMADO DE SECCION DE 0.15 X 0.70 M. EN 3.00M. DE ALTURA, INCLUYE: CORTADOR,TUBOS GALVANIZADOS, CABLEADOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA	PZA	1.00
DESMANTELAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y SU REHABILITACION INCLUYE EXCAVACION,CARGA ,FLETES ACARREOS,RETIRO,REPARACION,SOLDADURAS,LIMPIEZA,PINTURA,E INSTALACION PARA SEGURIDAD Y CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	6.00
SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL TIPO LAUREL DE LA INDIA DE 3.00 ML. DE ALTURA INCLUYE UBICACIÓN,EXCAVACION DE CEPAS ,RIEGO MANUAL POR 15 DIAS ,FLETES Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PLANTACION.	PZA	16.00
SUMINISTRO Y PLANTACION DE PASTO BUFEL, INCLUYE RIEGO LOS PRIMEROS 15 DIAS PARA SU CRECIMIENTO NATURAL,INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	3679.92
TRAZO Y NIVELACION DE AREA	M2	100.00
EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA EN CIMENTACION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION		18.36
PLANTILLA DE CONCRETO FC 150 KGS/CM2	M2	16.58
CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 20 CMS. DE ESPESOR CON VRS. DE 1/2 A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO FC 150 KGS./CM2 Y DADO DE 30 X 30 CON 6 VRS. DE 1/2 CON ESTRIBOS A CADA 20 CMS.	M3	3.06
DALA DE CERRAMIENTO DE CERRAMIENTO DE 15 X 25 CON 6 VRS. DE 3/8 Y ESTRIBOS A CADA 20 CMS. CON CONCRETO FC 200 KGS/CM2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	37.12
CASTILLO DE CONCRETO FC 150 KGS/CM2 ARMADA CON 4 VRS.. DE 3/8 CON ESTRIBOS A CADA 20 CMS. DEL NUM. 3 INCLUYE CIMBRA Y DESIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	9.60

COLUMNA DE CONCRETO FC 200KG/CM2 DE 30 CMS. DE DIAMETRO ARMADA CON 6 VRS. DE 1/2 Y ESTRIBOS A CADA 20 CMS. DEL NUM2 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION CIMBRA Y DECIMBRA. INCLUYE CIMBRA Y DESIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	19.20
MURO DE ENRASE DE CIMENTACION CON BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO POBRE DE 100 KG/CM2 ASENTADO CON MORETERO CEMENTO ARENA 1 -5	M2	31.89
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO PARA CONSTRUCCION DE NIVEL DE KIOSCO,INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTAS NESESARIAS MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	34.00
CONSTRUCCION DE LOSA ARMADA DE CONCRETO FC 200 KGS. /CM2 CON DOBLE EMPARRILLADO DE 20X20 CON VARILLA DE 3/8 INCLUYE CIMBRA, ARMADO Y COLADO ,MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	40.69
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE POLIESTIRENO DE 20 CM	ML	22.40
IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN APLICACION DE 3 CAPAS DE TERMOTEX O SIMILAR DE 5 AÑOS REFORZADO CON MALLA SEGUN ESPESIFICACIONES INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE SELLADO DE GRIETAS MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	40.69
APLICACIÓN DE ESTUCO EN LOSA DE KIOSCO INCLUYE MATERIALES ,ANDAMIOS HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	40.69
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL DE 90 CMS. DE ALTURA EN KIOSCO Y ESCALERA INCLUYE PINTURA INSTALACION Y MANO DE OBRA	M2	21.72
APLANADO DE MEZCLA EN EXTERIOR PERIMETRAL INFERIOR DE KIOSCO	M2	20.00
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA EN MUROS Y LOSA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	60.69

Plazo de ejecución PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE **90** DÍAS CALENDARIO, CONTADOS **DEL 16 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.**

EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA EN PLAZO MENOR A LO PACTADO DE EJECUCIÓN.

Disponibilidad del inmueble.
La dependencia dispuso al contratista de manera oportuna el inmueble en que se llevó a cabo los trabajos.

Anticipos. NO HUBO ANTICIPO
Forma de pago. Las partes manifiestan que los trabajos fueron liquidados mediante la presentación de estimaciones mensuales mismas que fueron liquidadas dentro de los 20 días naturales a partir de su autorización por parte del residente de obra.
Garantías. El contratista constituyó en forma y términos las siguientes garantías:

	MONTO ($)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA	VIGENCIA
1	$448,241.67	19A27855	DORAMA	31 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
2	$149,413.89	19A27858	DORAMA	31 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Representante del contratista. El contratista designo a su representante **permanente ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ mediante oficio sin número de fecha 16 DE JULIO DEL 2019.**
Responsabilidad del contratista. El contratista cumplió con lo establecido en esta cláusula en tiempo y forma. En lo relacionado a los materiales y equipo empleado estos cumplieron con las normas de calidad en vigor, realizándose los trabajos conforme a las especificaciones generales y particulares.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS.
TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. **GC-07 -19**
CONSTRUCCION DE PLAZA EN UN AREA DE 5361.36 M2 EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA EN EL NCP. NICOLAS BRAVO MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

MUNICIPIO DE ABASOLO

ACTA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. GC-07-19

TAM TAMAULIPAS

FINAL: Firman las personas que intervinieron en la presente Acta.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA
CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS

LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ
SUB DIRECTOR DE INFORMATICA

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

----------FIN DEL ACTA----------

MUNICIPIO DE ABASOLO

TAMAULIPAS

. Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación Social

NOMBRE	LISTADO DE OBRAS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ	CARGO	DIRECCIÓN Y No. TELEFÓNICO	FIRMA
Veronica Barajas Cortez				Veronica Cortez B
M. Belen Zavala Parra				Belen Zavala
Erica Vaca Gomez				Erica Vaca G
Sarita Murillo Campos				Sarita Murillo Campos
Teresa Hernandez Muñoz				Teresa Hdz Muñoz
Alicia Padilla de Leon				Alicia Padilla De León.
Teresa Muñoz Gonzalez				X
Gilberto Gil Tovar				Gilberto Gil T.
Rolando Figueroa Gonzalez				Rolando Figueroa
Carolina Hdz Muñoz				Carolina Hdz M
Irene Cardenas Gonzalez				Irene Cardenas G.
Ma del Rosario Cardenas Gonzalez				Ma del Rosario C.G.
Maria Teresa Medina Salas				Mª Teresa Medina S.
Olga Esthela Padilla de Leon				Anahí Olga Esthela Padilla de Leon
Ruth Anahi Garcia Rangel				
Severiano Perez Gonzalez				
Esthela de Leon Vazquez				Esthela de León

MUNICIPIO DE ABASOLO

TAMAULIPAS

Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación Social

NOMBRE	LISTADO DE OBRAS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ	CARGO	DIRECCIÓN Y No. TELEFÓNICO	FIRMA
Karla Lilia Tejeda Plascencia				Karla Tejeda
Angel Zavala Zavala				Angel Zavala Z.
Juan Antonio Sanchez Campos				
Antonio Zavala Calderon				
Alma Elena Espinoza Cardenas				Alma E. Espinoza Cárdenas.
Claudia Lopez Treviño				Claudia López
Juan Valdez Tijerina				
Joan Jose Orta Salinas				
Rosa Cortes Parra				Rosa Cortez
Ma Guadalupe Hdz Meza				Ma Gpe Hdz M
Renato Hdz Hervert				
Juan Franco Garcia				
Rafael Garcia Aguilera				
Elvira Medina Saavedra				Elvira Medina Saavedra
Isidro Hernandez Vargas				
Alejandra Hernandez Zamora				

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx

ABASOLO

MUNICIPIO DE ABASOLO

TAMAULIPAS

. Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación Social

NOMBRE	LISTADO DE OBRAS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ	CARGO	DIRECCIÓN Y No. TELEFÓNICO	FIRMA
Lidia Guadalupe Medina Garza				Lidia Gpe Medina Garza.
Patricia Mendoza Estrada				X
Ma. Guadalupe Guerrero Ledia				M= GPE. G. L.
Ricardo Vega Soto				Ricardo Vega
Maria de la Luz Rion Galvan				Maria de la Luz R
Adela Guzman Medina				Adela Guzmán Medina.
Martha Guadalupe Mendoza Estrada				Martha GPE Mendoza E
Irma Fabiola Mtz Hernandez				Fabiola Martinez.
Rosario Gpe Lores Andaverde				Rosario Lores A.
Enrique Paz Martinez				Enrique Paz
Jose Cortez Mendoza				Jose Cortez
