



**CONTRATO DE OBRA**

**N.º: FM-03-19**

lo anterior, la rescisión tendrá lugar en los siguientes casos y se tendrán que tomar las medidas que a continuación se establecen:

**A.- "EL MUNICIPIO"** procederá a la rescisión del Contrato por alguna de las siguientes causas: cuando "EL CONTRATISTA" no inicie los trabajos en la fecha pactada o lo suspenda injustificadamente ; incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, y a juicio de "EL MUNICIPIO" el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado, y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad; así como cualquier otra casusa que implique contravención a los términos del Contrato.

**B.- Cuando" EL MUNICIPIO"** determine justificadamente la rescisión administrativa del Contrato, la decisión correspondiente se comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", exponiendo las razones que al respecto se tuvieran para que éste, dentro del término de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga.

**C.- Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA".**

**D.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables "AL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder hacer efectivas las garantías.**

**DÉCIMA OCTAVA.-** Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la Obra en el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

**DÉCIMA NOVENA.- OBLIGACIONES.-** Las partes se obligan a sujetar estrictamente para la ejecución de la Obra objeto de este Contrato, todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado, Bases, Reglas y Procedimientos para la Obra Pública Municipal, y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

**VIGÉSIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.** "EL CONTRATISTA" aceptan que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:

*Eliacar M...  
[Firma]*





**CONTRATO DE OBRA**

**N.º: FM-03-19**

- A) El cinco al millar (0.5%) del monto de los trabajos contratados, para inspección de obras.
- B) El un por ciento al millar (0.1%) de retenciones.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.-** Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Abasolo, Tam; por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponder por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

ENTERADAS LA PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE EN ÉL ERROR, DOLO, LESIÓN, NI NINGÚN OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO, LO LEEN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD, EN MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL 2019.



**POR EL MUNICIPIO"**



**C. YESIKA YANET SELVERA GARRA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS**  
SÍNDICO MUNICIPAL

**C. MARTIN CASTILLO TORRES**  
SECRETARIO

**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ**  
DIRECTOR DE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

OBRAS  
PUBLICAS  
2018 - 2021

**LA CONTRATISTA**

**ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**

REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE  
ABASOLO TAM.

**OPERADO**

**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 835 01 77 / 335 02 29 y 335 00 91  
www.abasolo.gob.mx



**MPIO. DE ABASOLO, TAM. A 1 DE FEBRERO DEL 2019  
ASUNTO: ASIGNACION DE SUPERVISOR DE OBRA**


**ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**  
BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO #760 ENTRE  
CAMILO MANZO Y FELIPE DE LA GARZA  
COL. GPE. MAINERO  
CD. VICTORIA TAM.  
**PRESENTE:**

**POR ESTE CONDUCTO LE INFORMA A USTED QUE PARA EL PROCESO DE EJECUCION DE  
LA OBRA AMPARADA BAJO EL CONTRATO FM-03-19 LA SUPERVISION POR ESTE  
DEPARTAMENTO ESTARA A CARGO DEL ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA PARA CUMPLIR CON  
LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA.**

**OBRAS  
PÚBLICAS**  
C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS

**OPERADO**  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**

Haciendo realidad sus ideas



**DISEÑOS**

**Obras Civiles**

Redes de A. Potable y Alcantarillado

- Vivienda
- Escuelas
- Edificaciones
- Centros de Salud

**SUPERVISOR**

**AVISO DE INICIO DE OBRA Y ASIGNACION DE**

**2019.**

**ABASOLO TAM. A 1 DE FEBRERO DEL**

**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

Por medio del presente le informo que con esta fecha se iniciaron los trabajos correspondientes a la:

**REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.**

Amparados con el contrato FM-03-19, y a lo cual su servidor Ing. Armando David Vanoye Sánchez supervisara los trabajos para atender cualquier observación o sugerencia de parte de la supervisión del municipio y así cumplir con los trabajos contratados en tiempo y forma.

Sin otro de momento le envió un cordial saludo.

**OPERADO**

ATENTAMENTE

**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**

**ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ  
CONTRATISTA**

Haciendo realidad sus ideas



**DISEÑOS**

**Obras Civiles**

Redes de A. Potable y Alcantarillado

- Vivienda
- Escuelas
- Edificaciones
- Centros de Salud

obra

**Aviso de terminación de**

**2019.**

**Abasolo Tam. A 21 DE FEBRERO DEL**

**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

**Por medio del presente le informo que con esta fecha terminaron los trabajos correspondientes a la:**

**REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.**

**Del contrato FM-03-19. Para cualquier sugerencia u observación y para cumplir con los trabajos contratados en tiempo y forma.**

**Sin otro de momento le envío un cordial saludo.**

**Atentamente**

**Ing. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ  
Contratista**





# Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1  
AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

## POLIZA DE FIANZA

Lugar: CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS A 30-DE ENERO DE 2019	Fianza No. 2057440-0000
Fiado: VANOYE SANCHEZ ARMANDO DAVID *****	
Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO	Monto: \$9,897.38


Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:  
Nueve Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos 38/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 01 DE FEBRERO DE 2019  
DOMICILIO DEL FIADO: BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 760, COL. GUADALUPE MAINERO, C.P. 87100, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, MÉXICO  
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS  
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: CALLE LAZARO CARDENAS Y GUILLERMO PRIETO SIN NUMERO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS C.P. 87760

ANTE: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

POR ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, CON DOMICILIO EN BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 760, COL. GUADALUPE MAINERO C.P. 87100, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VASA521020A12 EL CUMPLIMIENTO, VICIOS OCULTOS Y BUENA CALIDAD DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN MODALIDAD: DE ADJUDICACION DIRECTA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO FM-03-19 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2019, QUE CELEBRA POR UNA PARTE MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, Y POR LA OTRA PARTE ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, RELATIVO A: REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. CON UN IMPORTE DE \$98,973.81 (NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y/O HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA, DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO RESPECTIVO, Y SOLO SE CANCELARA CUANDO ASI LO AUTORICE POR ESCRITO EL BENEFICIARIO. EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282, 291 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHOS PROCEDIMIENTOS CON EXCLUSION DE CUALQUIER OTRO. LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CREDITO A QUE ESTA POLIZA SE REFIERE AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN Y AL EFECTO LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. SE CONSTITUYE FIADORA DE ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD DEL IMPORTE DE ESTA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADOR NO CUMPLA CON EL CONTRATO DE REFERENCIA.-FIN DE TEXTO.-

\*\*\*\*\*

 <b>EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ</b> Director Comercial Div. Nte	LÍNEA DE VALIDACIÓN 14X8NdNX8
--	----------------------------------



**Emisor**  
RFC: VASA521020A12  
Razón Social: ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 87100 Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-02-21T13:07:04	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

**Receptor**  
RFC: MAT780101AGA Uso de CFDI: I01 - Construcciones  
Razón Social: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E51 - Trabajo	RECIBI DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE \$98,461.88 (NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA FM-03-19 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL N.C.P. DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM ClaveProdServ - 76121602 - Operaciones de relleno sanitario	85,322.25	85,322.25

**TOTAL EN LETRA:**  
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 88/100 MXN

Subtotal	85,322.25 MXN
IVAT 0.160000	13,651.56 MXN
RET. CONTRALORIA MPAL 0.50	426.61 MXN
RETENCION 0.10	85.32 MXN
<b>Total</b>	<b>98,461.88 MXN</b>

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[1.1]E0622852-360B-11E9-9FB5-00155D014009|2019-02-21T13:07:04|TBN040609RKA|zOZVpt7nP9|sDPvOFYwgSx8p3rQQRnAlsDjF15HoZ9p8C|Qp9qQ8U1IkxEmeckPU/5dsD10+BTzh0dBT80E37DBK97EYKlxwTE8|GWQxGkrqfL5+VfQd06YeagtoeHHmLHSxXqFYtuJvhlIkA0THSUCzeA4G4b/x+lwr42u7mRqw3zdgD3k5T3Ci+IJYyJf0kMEXMpyghpR4skKFsUb9bkj5n8a4Pw4wiJZyW5FvN3rvDWUyDXPzhGQKcJZGdNN2QrHnUkSsGS|Tj|OEcpaPj|X6NFG8KoX+XvbyaA15mNWRm7IE7L6MIArN Rnlugs4WEbs6l30nmm4s5n4g==|00001000000403557578|]

Sello digital del emisor  
IzOZVpt7nP9|sDPvOFYwgSx8p3rQQRnAlsDjF15HoZ9p8C|Qp9qQ8U1IkxEmeckPU/5dsD10+BTzh0dBT80E37DBK97EYKlxwTE8|GWQxGkrqfL5+VfQd06YeagtoeHHmLHSxXqFYtuJvhlIkA0THSUCzeA4G4b/x+lwr42u7mRqw3zdgD3k5T3Ci+IJYyJf0kMEXMpyghpR4skKFsUb9bkj5n8a4Pw4wiJZyW5FvN3rvDWUyDXPzhGQKcJZGdNN2QrHnUkSsGS|Tj|OEcpaPj|X6NFG8KoX+XvbyaA15mNWRm7IE7L6MIArN Rnlugs4WEbs6l30nmm4s5n4g==

Sello digital del SAT  
[1.1]7J0vu5TDpd8YoVvZAHxPrs71Tvtoc3+rVvaku5h0QWHmy27pt8UmuCTMwnCldiWoEYJIGcmQPNA5u6GvphOXHXkzmEeRYmZ6tshluqbPaCA3VExc7k33g|QkWRRxSLW9mcd4zrtDKpu9yIA100C0zht2d/oM/wQR0vrr+qO8S0HAeDXTor3eT/OMRucbDWRAMa8+DW2T0JN2/Hvs6AITNrwTZGQZNIal39a7S6vpPgzdiiZolV087S+4K5odNhsot8f6e9kCSic1Zvmcw1em4HcVx12WC0OuY2WP0W2IQG5jop2rAoZrHjjaS2u9b1G4kR mafjG3g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Pagos SPEI enviados

Fecha: 21/02/2019

Hora: 10:30:55

Página: 1

Fecha 'Valor: 21/02/2019 Clave de Rastreo: HSBC088565  
Fecha de proceso de la instrucción: 21/02/2019 Hora de proceso de la instrucción: 16:12:22 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4062214390  
Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS  
Referencia del ordenante: FM0319  
Comisión cobrada: 8.00  
Moneda: MXN  
Monto: 98,461.88

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 072810002156902634 Referencia Numérica:  
Nombre del Beneficiario: ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ  
Banco Beneficiario: BANORTE/IXE  
Concepto de Pago:



Informe procesado por: G/ RZA, YESIKA (MUNICIPIO21)

Autorización del pago > Detalles > Acuse de recibo - Pago preferente (autorizar)

Información del Banco	
Fecha valor (dd/mm/aaaa)	21/02/2019
Referencia de la instrucción	14855EM0255J
Referencia del cliente	FM0319
Cuenta de débito	MXHBMICA4062214390
Divisa del pago	MXN
Divisa de la instrucción	MXN
Importe de la instrucción	98,461.88
Nombre del beneficiario	ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ
Banco beneficiario	BANORTE/IXE
Cuenta de crédito o beneficiario	072810002156902634
Estado	En proceso por el banco
Se encontraron errores o advertencias	

Hora del informe: 21 Feb 2019 10:12:21 GMT

-Fin del informe-





<b>R E C I B O</b>			
OBRA: REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			
LOCALIDAD: NCP. GUADALUPE VICTORIA	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM.		
RAMO: FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ			
DOMICILIO: BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO # 760 COL. GPE. MAINERO CD. VICTORIA, TAM.			
R.F.C. VASA521020A12	IMP. DEL CONTRATO \$ 98,973.81		
RECIBÍ DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO: \$ 98,461.87			
(NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 87 /100 M.N.)			
21 DE FEBRERO DEL 2019			
BUENO POR: \$ 98,973.81			
FECHAS DE EJECUCION DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019			
TRABAJO DE: 1 (UNICA)	OBRA: REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.		
EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:			
ANTICIPOS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO POR AMORTIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>D E D U C C I O N E S</b>			
0.10% RETENCION	\$	85.32	
0.50% SECODAM:	\$	426.61	
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	511.94	
<b>OPERADO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019</b>			
IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 85,322.25			
AMORTIZACION DE ANTIPO SUB-TOTAL \$ 85,322.25			
I.V.A. \$ 13,651.56			
TOTAL \$ 98,973.81			
MUNICIPIO DE ABASOLO \$ 98,973.81			
PAGOS ANTERIORES \$ 98,973.81			
SUB-TOTAL \$ 98,973.81			
NETO A PAGAR \$ 0.00			
DEDUCCIONES 0.50 % DE SECODAM: \$			
PENAL CONVENCIONAL \$			
FINANCIERO ACUM. ANTERIOR \$			
FISICO 100% \$			
PROGRAMADO % 100% \$			
ESTIMADO % 100% \$			
DEVOLUCION \$			
POR APLICAR \$			
SALDO DE ASIGNACION \$ 0.00			
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ		C. HOMERO COMPE RODRIGUEZ	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	
2018 - 2021		2018 - 2021	
SECRETARÍA MUNICIPAL		SECRETARÍA MUNICIPAL	
AYUNTAMIENTO		AYUNTAMIENTO	
2018 - 2021		2018 - 2021	
L.C. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA		L.C. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA	
CONTRALOR MUNICIPAL		CONTRALOR MUNICIPAL	
2018 - 2021		2018 - 2021	

**E S T I M A C I O N**

<p><b>OBRA: REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.</b></p>										<p>ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1</p>	
<p>LOCALIDAD: NCP. GUADALUPE VICTORIA</p>		<p>MUNICIPIO: ABASOLO, TAM</p>			<p>RAMO: FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL</p>			<p>Nº DE CONTRATO: FM-03-19</p>			
<p>CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ</p>										<p>PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019</p>	
<p>META: 4521.00 M2</p>										<p>21 DE FEBRERO DEL 2019</p>	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. (\$)	V O L U M E N			IMPORTE (\$)				
				ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO EXCEDENTE					
1	LIMPIEZA Y REACOMODO DE RESIDUOS SOLIDOS CON MAQUINARIA EN UNA AREA DE 66.00 X 68.50 ML. CON UNA ALTURA DE 1.70 :INCLUYE TRASLADO DE MAQUINARIA , MANO DE OBRA Y EQUIPO AL LUGAR DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	m2	4521.00	\$ 18.87	0.00	18.87	0.00	\$ 85,322.25			
							SUBTOTAL	\$ 85,322.25			
<p>ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ</p>										<p>ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA</p>	
<p>CONTRATISTA</p>										<p>Lorenzo A. Alvarez. SUPERVISOR</p>	

**OPERADO**  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**



MUNICIPIO DE  
**ABASOLO**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



**NUMEROS GENERADORES**

GENERADOR N°: 1 (UNICO)

OBRA: REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

LOCALIDAD: NCP. GUADALUPE VICTORIA	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	N° DE CONTRATO: FM-03-19		PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019					
		FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2019		PRESENTES	ACUM	EXED	POR EFEC		
META: 4521.00 M2									
1	LIMPIEZA Y REACOMODO DE RESIDUOS SOLIDOS CON MAQUINARIA EN UNA AREA DE 66.00 X 68.50 ML. CON UNA ALTURA DE 1.70 :INCLUYE TRASLADO DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO AL LUGAR DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	66.00	68.50	M2	4521.00	0	4521.00	0.00	0.00
ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ				ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA					
CONTRATISTA				Lorenzo Alvarez Z.					
				SUPERVISOR					

**OPERADO**  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**


**CROQUIS**

GENERADOR N°: 1 (UNICO)

OBRA: REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

LOCALIDAD: NCP. GUADALUPE VICTORIA	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	N° DE CONTRATO: FM-03-19	PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019
META: 4521.00 M2		21 DE FEBRERO DEL 2019	

68.50 ML.



66.00

**OPERADO**  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**

ING. ARMANDO DAVID YANUZE SANCHEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

*Lorenzo A. Alvarez z.*

SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRAFICO

GENERADOR N°: 1 (UNICO)

OBRA: REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

LOCALIDAD: NCP. GUADALUPE VICTORIA	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	N° DE CONTRATO: FM-03-19	PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019
OBRA: REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.		FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2019	

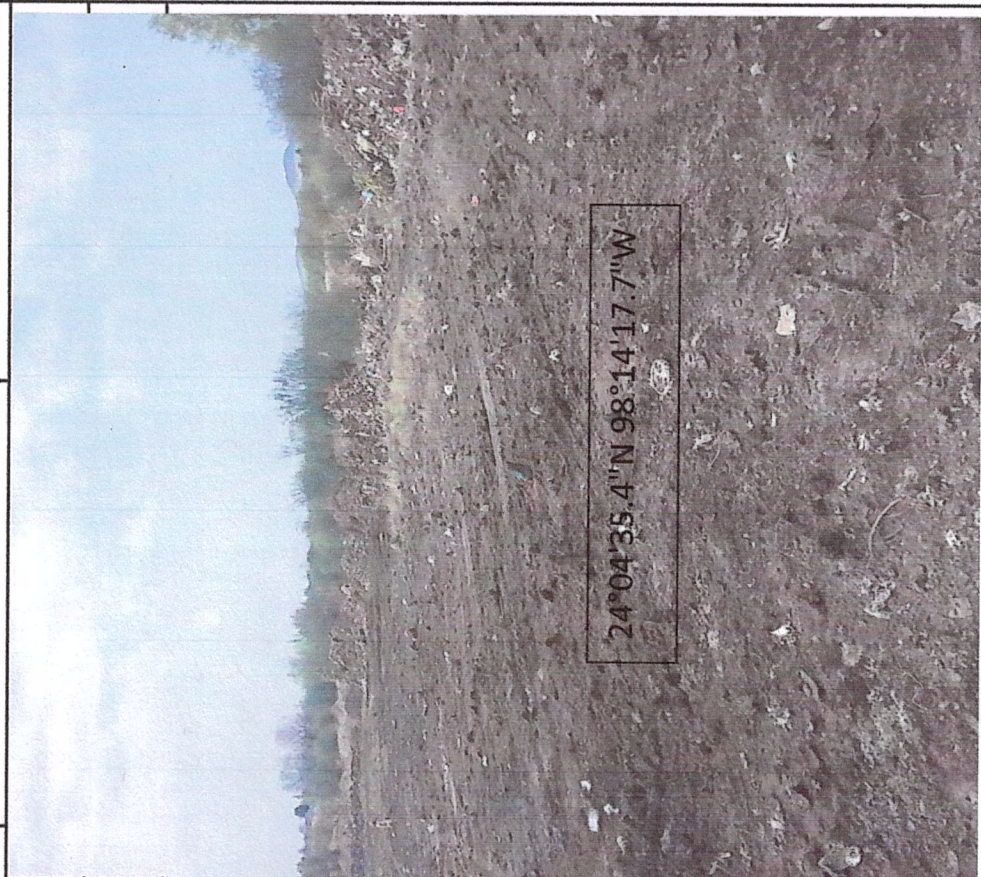

ING. ARMANDO DAVID VANGYE SANCHEZ

*[Signature]*  
 CONTRATISTA

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

*[Signature]*  
 SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. DE ABASOLO, TAM.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

GENERADOR N°: 1 (UNICO)

OBRA: REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

LOCALIDAD: NCP. GUADALUPE VICTORIA


MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

N° DE CONTRATO: FM-03-19

OBRA: REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2019

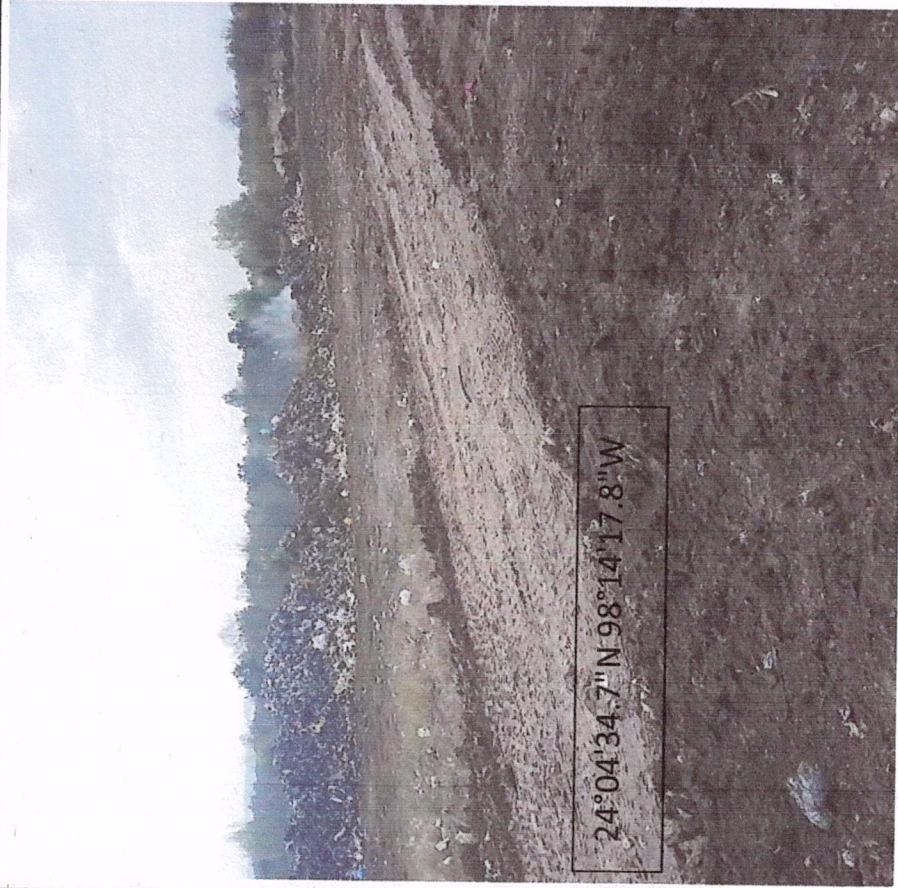

ING. ARMANDO DAVILA VANDYME SANCHEZ

*[Signature]*  
 CONTRATISTA

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

*[Signature]*  
 SUPERVISOR



REPORTE FOTOGRAFICO

GENERADOR N°: 1 (UNICO)

OBRA: REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

LOCALIDAD: NCP. GUADALUPE VICTORIA


MUNICIPIO: ABASOLO, TAM

N° DE CONTRATO: FM-03-19

OBRA: REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2019

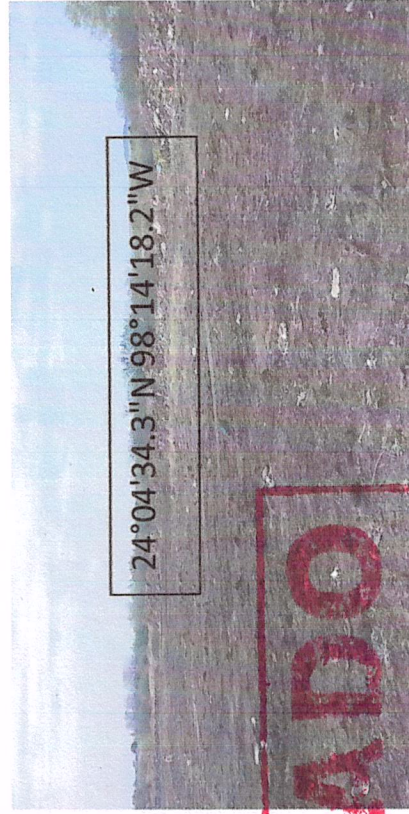

**OTORGADO**  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**

ING. ARMANDO DAVID VANDUYE

ING. LORENZO A. ALVAREZ ZAPATA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Lorenzo A. Alvarez Z.



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO N°: FM-03-19

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2019

### DATOS GENERALES:

OBRA: REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO EN EL N.C.P DE GUADALUPE VICTORIA EN MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 01 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2019.

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATISTA: ING. ARMANDO DAVID VANOYE SÁNCHEZ

DOMICILIO FISCAL: BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO #760 COL. MAINERO CIUDAD VICTORIA, TAM. C.P. 87100

R.F.C.: VASA521020A12

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, C. YESIKA YANET SELVERA GARZA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

ESTABLECIENDO EN CASO DE EXISTIR UNA MALA CALIDAD O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARARLOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.

UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS QUEDANDO DE CONFORMIDAD:

ENTREGA:

ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

RECIBE:

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



**ACTA FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. FM-03-19**



**I.- LUGAR, FECHA Y HORA:**

EN **ABASOLO TAM.** SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **21** DEL MES DE **FEBRERO** DEL AÑO **DOS MIL DIECINUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

**II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:**

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMP, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE": REPRESENTADA POR LA C. **YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. LIC. **EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA**. CONTRALOR MUNICIPAL, LIC. **LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL C. **HOMERO CONDE RODRIGUEZ**. DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**.

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

**REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.**



**ACTA FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. FM-03-19**



<p><b>LIMPIEZA Y REACOMODO DE RESIDUOS SOLIDOS CON MAQUINARIA EN UNA AREA DE 66.00 X 68.50 ML. CON UNA ALTURA DE 1.70 :INCLUYE TRASLADO DE MAQUINARIA , MANO DE OBRA Y EQUIPO AL LUGAR DE LA OBRA ,Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION</b></p>	<p><b>m2</b></p>	<p><b>4521.00</b></p>
--	------------------	-----------------------



**ACTA FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. FM-03-19**



**III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:**

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL **CONTRATO No. FM-03-19** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA ENTRE “**LA CONTRATANTE**” Y “**LA CONTRATISTA**”, CON UN MONTO ORIGINAL DE **\$98,973.81 (NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.

**IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE **20 DÍAS CALENDARIO**, CONTADOS **DEL 1 DE FEBRERO DEL 2019 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019.**

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **21 DE FEBRERO DEL 2019**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **21 (DIAS.)** CALENDARIO.

**V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:**

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$) S/I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
UNICA	1 DE FEBRERO DEL 2019 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019	\$85,322.25	0.00	0.00	\$511.94	A1 304

**RESUMEN:**

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES UNICA	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$98,973.81	0.00	0.00



**ACTA FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. FM-03-19**



**VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:**

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE

CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA
\$9,897.38	2057440-0000	LIBERTY FIANZAS

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ** MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA **22 DE FEBRERO** DEL AÑO **DOS MIL DIECINUEVE**, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



**ACTA FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO No. FM-03-19**



**ENTREGA**

**POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ARMANDO DAVID VANOYS SANCHEZ**

**POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.**


  
\_\_\_\_\_  
**C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA**

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**TESTIGOS**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ**

**SUB DIRECTOR DE INFORMATICA**

  
\_\_\_\_\_  
**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ**

**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

**OPERADO**  
FIN DEL ACTA  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**

Municipio de Abasolo Admón.  
2018-2021

Palacio municipal  
Guillermo Prieto s/n  
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760  
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91  
[www.abasolo.gob.mx](http://www.abasolo.gob.mx)



**ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES**

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **FM/03/19** CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA FM/03/19.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

EN **ABASOLO TAM.**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

**NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:**

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE": REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. EL **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA** CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL **C. HOMERO CONDE RODRÍGUEZ** DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **ING. ARMANDO DAVID VANOYE SÁNCHEZ**.

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.**

**REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.**

**CONTRATO QUE SE CUMPLIERON DEL 01 DE FEBRERO DEL 2019 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019.**



<b>LIMPIEZA Y REACOMODO DE RESIDUOS SOLIDOS CON MAQUINARIA EN UNA AREA DE 66.00 X 68.50 ML. CON UNA ALTURA DE 1.70 :INCLUYE TRASLADO DE MAQUINARIA , MANO DE OBRA Y EQUIPO AL LUGAR DE LA OBRA ,Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION</b>	<b>m2</b>	<b>4521.00</b>
---	-----------	----------------

**Plazo de ejecución PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE 20 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 1 FEBRERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2019.**



**EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA EN PLAZO MENOR A LO PACTADO DE EJECUCIÓN.**

**Disponibilidad del inmueble.**

**La dependencia dispuso al contratista de manera oportuna el inmueble en que se llevó a cabo los trabajos.**

**Anticipos. NO HUBO ANTICIPO**

**Forma de pago. Las partes manifiestan que los trabajos fueron liquidados mediante la presentación de estimaciones mensuales mismas que fueron liquidadas dentro de los 20 días naturales a partir de su autorización por parte del residente de obra.**

**Garantías. El contratista constituyó en forma y términos las siguientes garantías:**

	<b>MONTO (\$)</b>	<b>FIANZA NÚMERO</b>	<b>AFIANZADORA</b>	<b>VIGENCIA</b>
<b>VICIOS OCULTOS</b>	\$9,897.38	2057440-0000	LIBERTY FIANZAS	22 DE FEBRERO DEL 2019 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020

**Representante del contratista. El contratista designo a su representante permanente ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ mediante oficio sin número de fecha 1 DE FEBRERO DEL 2019.**

**Responsabilidad del contratista. El contratista cumplió con lo establecido en esta cláusula en tiempo y forma. En lo relacionado a los materiales y equipo empleado estos cumplieron con las normas de calidad en vigor, realizándose los trabajos conforme a las especificaciones generales y particulares.**

**MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS.**

**TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. FM-03-19**

**REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL NCP. DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM**




**ACTA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES  
CONTRATO No. FM-03-19**




**FINAL: Firman las personas que intervinieron en la presente Acta.**


**ENTREGA**

**POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA**


  
\_\_\_\_\_  
**ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ**


**POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.**

  
\_\_\_\_\_  
**C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA**  
CONTRALOR MUNICIPAL

**TESTIGOS**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ**  
DIRECTOR DE INFORMATICA

  
\_\_\_\_\_  
**C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ**  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

-----  
**FIN DEL ACTA**  
-----

**OPERADO**  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**

**MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.  
ADMINISTRACION 2018-2021**




FOLIO: 01

**BITÁCORA DE OBRA:**

**DATOS DE LA OBRA**

MUNICIPIO	Abasolo	No. DE CONTRATO	FM-03-19
NOMBRE DE LA OBRA	Rehabilitación de relleno Sanitario		
UBICACIÓN DE LA OBRA	N.C.P. de Guadalupe Victoria en el Municipio de Abasolo		
CONTRATISTA	Ing. Armando David Vanoye Sanchez		
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Armando David Vanoye Sanchez		
FECHA DE INICIO	01/Feb/19	FECHA DE TERMINO	20/Feb/19

**REGISTRO DE FIRMAS**

	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C. Homero Conde Rodriguez	
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA	Ing. Armando David Vanoye Sanchez	
SUPERVISOR DE OBRA	Ing. Lorenzo Antonio Alvarez Zapata	Lorenzo Antonio Alvarez Z.
RESIDENTE DE OBRA	Ing. Armando David Vanoye Sanchez	

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

Rehabilitación de relleno sanitario en el N.C.P. de Guadalupe Victoria en el Municipio de Abasolo, Tam, que incluye limpieza y reacomodo de residuos solidos con maquinaria en un area de 66.00 x 68.50 ML. con una altura de 1.70; incluye traslado de maquinaria, mano de obra y equipo al lugar de la obra, así como todo lo necesario para su ejecución.



# PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 2019.

ANEXO PLAN DE OBRA 2019			
PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019			
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio
1	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	
2	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	
3	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	
4	CUARTOS DORMITORIO	EL PARRAS DE LA FUENTE	
5	CUARTOS DORMITORIO	COL. BEATRIZ AMAYA	
6	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	
7	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	
8	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	
9	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	
10	CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL	
11	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	
12	CUARTOS DORMITORIO	EL EL MODELO	
13	CUARTOS DORMITORIO	EL JESUS RAMIREZ	
14	CONSTRUCCION DE 12x7.71 M DE LODAS MONOLITICAS	CABECERA MUNICIPAL	
15	CONSTRUCCION DE 192.65 M2 DE LODAS MONOLITICAS	EL EL MODELO Y L. RAMIREZ	
16	CUARTOS DORMITORIO	EL EL MODELO	
17	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	
18	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. NICOLAS BRAVO	
19	CUARTOS DORMITORIO	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA	
20	CUARTOS DORMITORIO	DOLORES	
21	CUARTOS DORMITORIO	EL GUARDALUPE VICTORIA	
22	CONSTRUCCION DE BAÑOS DE 1:10 X 1:80	EL GUARDALUPE VICTORIA	
23	CUARTOS DORMITORIO	EL GUARDALUPE VICTORIA	
24	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON 7 DESCARGAS	EL GUARDALUPE VICTORIA	
25	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON 8 DESCARGAS	EL GUARDALUPE VICTORIA	
26	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EL GUARDALUPE VICTORIA	
27	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EL GUARDALUPE VICTORIA	
28	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EL GUARDALUPE VICTORIA	
29	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EL GUARDALUPE VICTORIA	
30	CONSTRUCCION DE 670.40 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	EL GUARDALUPE VICTORIA	
31	CONSTRUCCION DE 453.00 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	EL GUARDALUPE VICTORIA	
32	CONSTRUCCION DE 459.60 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	EL GUARDALUPE VICTORIA	
33	REHABILITACION DE CUERPOS PULVICALES Y DESBOLQUE DE VAJOS	EL GUARDALUPE VICTORIA	
34	REHABILITACION DE ACCESO	EL GUARDALUPE VICTORIA	
TOTAL OBRA DIRECTA			
OBRA COMPLEMENTARIA			
35	CONSTRUCCION DE 453.00 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	EL GUARDALUPE VICTORIA	
36	CONSTRUCCION DE 459.60 M2 DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	EL GUARDALUPE VICTORIA	
37	REHABILITACION DE CUERPOS PULVICALES Y DESBOLQUE DE VAJOS	EL GUARDALUPE VICTORIA	
38	REHABILITACION DE ACCESO	EL GUARDALUPE VICTORIA	
TOTAL OBRA FINANCIADA			
TOTAL			
TECHO FINANCIERO			

PLAN DE OBRA PUBLICA 2019			
PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019			
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio
2	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO	EL PARRAS DE LA FUENTE	
3	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. BEATRIZ AMAYA	
TOTAL			
PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS RECURSOS MARITIMOS 2019			
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio
1	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA	CALLE RIO SAN LORENZO ENTRE RIO PANTUYA Y CALLE SIN NOMBRE
TOTAL			
PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE 2019			
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio
1	REHABILITACION DE TIRADERO SANITARIO	N.C.P. DOLORES	
2	REHABILITACION DE TIRADERO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	
3	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CUNCHA COMUN	CABECERA MUNICIPAL	
4	CONSTRUCCION AMPLIACION DE TECHUMBRE	N.C.P. MORELOS	CALLE HIDALGO ENTRE EIDAL Y MENDEZ
5	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 6.00 X 6.00	ARION DE NIÑOS MARGARITA ROMERO MAVERS	ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SANTOS VALDEZ SALAZAR
6	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	CABECERA MUNICIPAL	PLAZA PRINCIPAL
TOTAL			
PROGRAMA DE OBRA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 2019			
No.	Denominación de la obra o acción	Localidad / Colonia	Domicilio
1	REHABILITACION DE 90.00 ML. DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	EL GUIA DEL PORVENIR	
2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE	EL GUIA DEL PORVENIR	
3	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	N.C.P. DOLORES	
4	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	VICTORIA	
5	REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE 150.00 ML. DE GUARNICIONES Y M2 DE ENCLAVAMIENTO	CABECERA MUNICIPAL	EN LA CALLE M. ALEMAN ENTRE RIO 1 Y RIO 2
6	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE TECHUMBRE	CABECERA MUNICIPAL	PLAZA PRINCIPAL "MARIANO ABASCOS"
TOTAL			

10 de Enero del 2020

Buenos Dias Señora Presidenta  
yerika Yanet Salvera Garza Reciba  
un Cordial Saludo, Por medio de la  
presente En nombre de mis compañeros  
de N.C.P. Guadalupe Victoria le pedimos  
de Su Apoyo para la Rehabilitación  
del Rayeno Sanitario ya que no se  
puede entrar a tirar la basura por que  
esta totalmente llano y no se puede  
entrar a tirar la basura.

Emeterio Ibarra

Jose Luis Nava

Orelia Reyes

Jose Guadalupe Martinez Camacho

Yadira Cardenas Gomez

Girebil Perez Barran



**Anexo 2.3. Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación Social FISMDF**

NOMBRE	LISTADO DE OBRAS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ	CARGO	DIRECCIÓN Y No. TELEFÓNICO	FIRMA
Emetelo Hava.	Rehabilitación de Reveros Sombano.	Presidente	x	Emetelo Hava.
Jose Luis Nava.	" "	Tesorero	x	Jose Luis Nava.
Olivia Reyes.	" "	Secretario	x	Olivia Reyes.
Jose Guadalupe Martinez Camacho	" "	1º vocal	x	Jose Gye. martinez Camacho.
Yadira Castanos Gomez.	" "	2º vocal	x	Yadira Castanos Gomez.
Claudia Perez Lora.	" "	3º vocal	x	Claudia Perez Lora.

**OPERADO**  
**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019**
